

2023

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Timestre y año que se reporta  
**2do. Trimestre 2023**

Fecha de elaboración: 30 junio 2023

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

LOGO DE LA INSTITUCIÓN



Nombre: Universidad Veracruzana  
Entidad Federativa: Veracruz  
Clave U11: 3018SU0409

Nombre: Mtra. Norma Angélica Lagunes López  
Cargo: Encargada de la Dirección de Planeación Institucional  
Teléfono: (228) 8421700 EXT. 12719  
Correo electrónico: nlagunes@uv.mx

Planesón

RESPONSABLES

Nombre: Arq. Miguel Ángel Cano Asseleñ  
Cargo: Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento  
Teléfono: (228) 8421700 EXT. 12702  
Correo electrónico: mcano@uv.mx

Obras y Mantenimiento

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Ed de acuerdo con el CFE/SAIA	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto	Monto autorizado (A)	CONTRATO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA						Espacios físico-equipamiento (progresado/autorizado)			Acciones que sustentan el avance	Fechas Reales		Observaciones	Reintegro a la TESOFE		Actos																				
					No. (s) de Contrato (C)	Fecha(s) Programada(s)		Monto Contratado (B)	Covariante	Monto no Contratado (C) Diferencia ante Autorizado y Contratado C=A-B	Monto ejercido (D)	Remanente (E)=B-D	Nombre del Espacio/equipo		Cantidad	Metros Cuadrados		% de avance	Inicio	Termino	Linea de Captura	Fecha de pag	Inventa	Entrega-Placación (Acto Inicial) MONTO	Fecha	Acto Administrativo de Entrega-Placación (Forma DGE/BU) MONTO	Fecha													
						INICIO	TERMINO																					GLOBAL DEL PROYECTO	GLOBAL DEL PROYECTO											
					GLOBAL DEL PROYECTO	GLOBAL DEL PROYECTO	GLOBAL DEL PROYECTO	GLOBAL DEL PROYECTO	GLOBAL DEL PROYECTO																															
1	1	Construcción de edificio de consultorios para la Unidad de Ciencias de la Salud, región Coahuila-Resistencia		\$ 3,000,000.00		01/03/2023	31/12/2023	\$ -		\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ -	Sanjorio	2	85.70	En proceso de licitación																								
2	3	Construcción 2a. Etapa del edificio "C" (1 aula) en la Universidad Veracruzana Intercultural sede Totomaxpan en Espinal, Ver.	X	\$ 1,499,240.00		01/03/2023	31/12/2023	\$ -		\$ 1,499,240.00	\$ -	\$ -	Aulas	1	27.82	En proceso de licitación																								
													Circulaciones	1	30.58																									
													TOTAL		68.20																									
3	4	Construcción 2a. etapa edificio "C" en la Facultad de Administración, región Veracruz.	X	\$ 4,000,000.00		01/03/2023	31/12/2023	\$ -		\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ -	Aulas	1	53.63	En proceso de licitación																								
													Cubículas	4	47.18																									
													Sanitarios	2	11.33																									
													Áreas Comunes	1	54.60																									
													TOTAL		167.31																									
4	8	Construcción 2a. Etapa del edificio "C" para clínicas de simulación odontológica y aulas múltiples (Inc. Elevador) en la Facultad de Odontología, región Orizaba-Oriónba	X	\$ 8,808,428.00		01/07/2023	31/12/2023	\$ -		\$ 8,808,428.00	\$ -	\$ -	clínicas de simuladores	1	55.61	En proceso de licitación																								
													Baños	2	36.86																									
													Circulación (Inc. Elevador)	1	220.11																									
													Salón de usos múltiples	2	92.08																									
													TOTAL		494.88																									

La asignación de recursos del FAM 2023 fue informada por la DGE/BU mediante el Núm. 511/2023-0613-82 con fecha 17/ab23. La asignación de otros del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2023 en esta instancia mediante el Núm. 511/2023-1686-2 de fecha 27/mar23. A partir de esta fecha se incluye los montos ante el Gobierno del Estado para la realización de las contrataciones a la LV y a la fecha se han realizado \$1,154,881.66 de acuerdo al calendario de contrataciones mensuales.

Arq. Miguel Ángel Cano Asseleñ  
Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

Mtra. Norma Angélica Lagunes López  
Encargada de la Dirección de Planeación Institucional

Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez  
Rector

1. Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.  
2. En esta sección se redacta de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se deben reflejar en el reporte fotográfico.  
3. Es importante que los montos de inicio y término estén actualizados. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.



2023

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:  
**2do. Trimestre 2023**

Fecha de elaboración: 30/junio/2023

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

LOGO DE LA INSTITUCIÓN



Universidad Veracruzana

Porcentaje de avance

0%


PROYECTO

1

Nombre de la obra:

Construcción de núcleo de sanitarios para la Unidad de Ciencias de la Salud, región Coatzacoalcos-Minatitlán


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

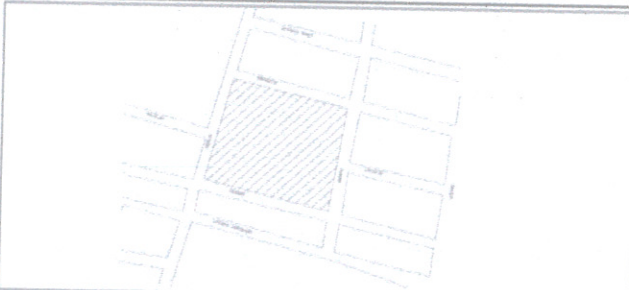

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

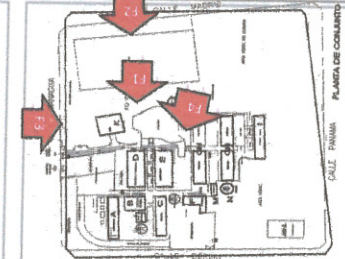

MANAGUA ESQ. BERLIN, MADRID, PANAMA, COL. NUEVA MINATITLÁN, MANZ. 27 Y 31, MINATITLÁN, VER.

FOTOS



F1



F2



F3



F4

Observaciones:

Obra por iniciar

*[Signature]*  
Ara. Miguel Ángel Cano Asseleih  
Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

*[Signature]*  
Mtra. Norma Angélica Caguas López  
Encargada de la Dirección de Planeación Institucional

*[Signature]*  
Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez  
Rector

NOTA:

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



2023

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

2do. Trimestre 2023

Fecha de elaboración: 30/junio/2023

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

LOGO DE LA INSTITUCIÓN



Universidad Veracruzana

Porcentaje de avance

0%

PROGRAMA

2


Nombre de la obra:

Construcción 2a. Etapa del edificio "C" (1 aula) en la Universidad Veracruzana Intercultural sede Totonacapan en Espinal, Ver.


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

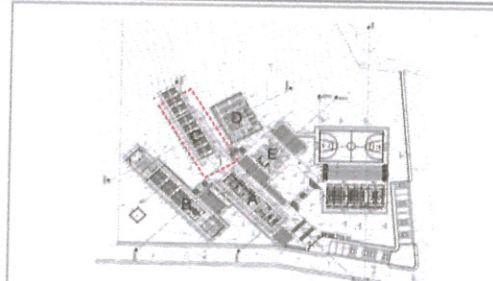

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

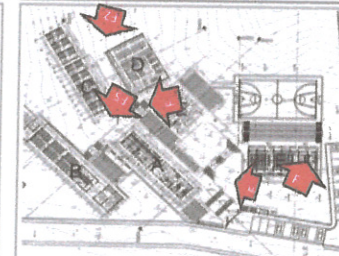

CALLE TECOLUTLA SIN COL CORPUS CHRISTI, ESPINAL, VER.

FOTOS



F1: Exterior



F2: Exterior

Observaciones:  
Obra por iniciar



F3: Exterior



F4: Exterior



F5: Exterior

*[Signature]*  
Arq. Miguel Ángel Cano Asseleh  
Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

*[Signature]*  
Mtra. Norma Angélica Lagunes López  
Encargada de la Dirección de Planeación Institucional

*[Signature]*  
Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez  
Rector

NOTA:

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.  
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



2023

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

2do. Trimestre 2023

Fecha de elaboración: 30/junio/2023

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

LOGO DE LA INSTITUCIÓN



Universidad Veracruzana

Porcentaje de avance

0%

PRIMORDIA

3


Nombre de la obra:

Construcción 3a. etapa edificio "D" en la Facultad de Administración, región Veracruz.

GROREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



CALLE PUESTA DEL SOL S/N MANZANA 5, FRACC. VISTAMAR, VERACRUZ, VER.

FOTOS



F1



F2



F3



F4

Observaciones :

Obra por iniciar



F5

Arq. Miguel Ángel Cano Asserán  
Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

Mtra. Norma Angélica Lagunes López  
Encargada de la Dirección de Planeación Institucional

Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez  
Rector

NOTA:

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

### REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

LOGO DE LA INSTITUCIÓN



Universidad Veracruzana

Porcentaje de avance


# 0%

PRIORIDAD


4

Nombre de la obra: **Construcción 2a. Etapa del edificio "C" para clínica de simulación odontológica y usos múltiples (inc. Elevador) en la Facultad de Odontología, región Orizaba-Córdoba**

#### GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

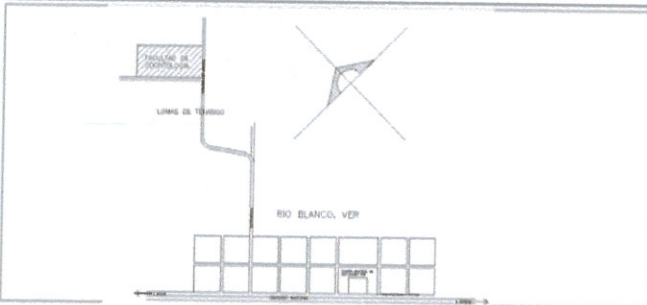

#### CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

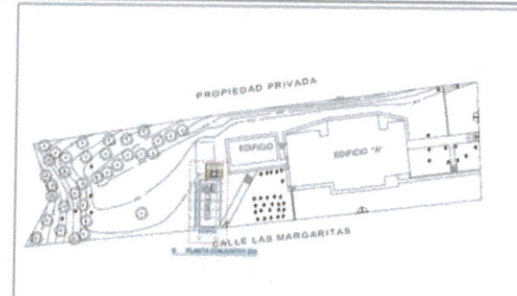

#### UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



ABASOLO ESQ. AV. MARGARITA, CONG. DE TENANGO, RÍO BLANCO, VER.

### FOTOS



F1



F2



F3



F4

Observaciones :  
Obra por iniciar



F5

*[Signature]*  
Arq. Miguel Ángel Cano Asseleh  
Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

*[Signature]*  
Mtra. Norma Angélica Lagunes López  
Encargada de la Dirección de Planeación Institucional

*[Signature]*  
Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez  
Rector

**NOTA:**  
\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
