



Universidad Veracruzana

Secretaría de Desarrollo Institucional
Dirección de Planeación Institucional

Of. No. DPI 013/DPI/20
10 de enero de 2020

Dr. Isaías Elizarraraz Alcaraz
Director de Fortalecimiento Institucional
Presente:

Estimado Dr. Elizarraraz Alcaraz:

Por indicaciones de la Dra. Sara D. Ladrón de Guevara González, Rectora de la Universidad Veracruzana, me permito enviar adjunto a este, un disco compacto que contiene los archivos electrónicos de los reportes de avances mensuales correspondientes al mes de diciembre de 2019, con los programas de infraestructura física financiados con el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), en los ejercicios de 2013, 2018 remanentes, 2018 remanente rendimientos financieros, FAM 2019, FAM 2019 remanentes, FAM 2019 remanentes rendimientos financieros.

Por último, le comento que los informes mencionados son elaborados por la instancia universitaria correspondiente que atiende los requerimientos de infraestructura física universitaria de esta casa de estudios, la Dirección de Proyectos Construcciones y Mantenimiento.

Sin otro particular, reciba un saludo cordial.

Atentamente.

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia Luz”

Dra. Laura E. Martínez Márquez
Directora

- c.c.p. Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta, Directora General de Educación Superior Universitaria. - Presente.
- c.c.p. Mtra. Ma. Del Rocío Chávez Mayo. Subdirectora de Fomento Institucional. - Presente.
- c.c.p. Dra. Sara D. Ladrón de Guevara González. Rectora de la Universidad Veracruzana. - Presente.
- c.c.p. Dr. Octavio A. Ochoa Contreras, Secretario de Desarrollo Institucional. - Presente.
- c.c.p. M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo, Directora de Proyectos Construcciones y Mantenimiento. - Presente.
- c.c.p. Archivo.

Lomas del Estadio s/n
Zona Universitaria,
C.P. 91000
Edificio "A" Rectoría
4º Piso

Teléfono
(228) 8422719
(228) 8421718

Conmutador
(228) 8421700
Ext. 12719, 11718

Correo electrónico
lmartinez@uv.mx

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: **Universidad Veracruzana**
Entidad Federativa: Veracruz
Clave Inst 911: 30MSU09408

RESPONSABLES

Planear: ón
Nombre: **Dra. Laura Martínez Márquez**
Cargo: Directora de Planeación Institucional
Teléfono: (01228) 8421700 EXT. 12718
Correo electrónico: lmartm@uv.mx

Obras y Mantenimiento
Nombre: **M. Arq. Emilia P. Rodiles Julo**
Cargo: Directora de Proyectos, Consultorías y Mantenimiento
Teléfono: (01228) 8421700 EXT. 12702
Correo electrónico: erodiles@uv.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
		Obras de infraestructura	Equipamiento	Mantenimiento y Reparación	Mantenimiento				Proyecto de construcción	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega- Recepción (Acta final)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción
1	Implementación de tecnologías que permitan el ahorro de energía y consumo de agua, así como construcción de cisterna y biodigestores en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, región Xalapa		X			\$ 1,250,000.00	\$ 1,249,987.53	\$ 12.47	Canal pluvial 1 125.00 Cisterna 1 35.00 Tinaco 4 1100.00 Biodigestor 2 7000.00 Muebles sanitarios 25 Lámparas 325	Obra concluida		100	17/09/19	30/12/19									
2	Continuación de la construcción del edificio para la Facultad de Matemáticas, de Física y el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial, región Xalapa	X				\$ 6,500,000.00	\$ 6,499,790.06	\$ 209.94	Aula 9 490.00 Laboratorio 4 441.00 Cubículos 14 240.00 Oficinas 13 328.00 Centro de cómputo 1 132.00 Área común 1 630.00	Obra concluida		100	14/08/19	19/02/20	La asignación de recursos del FAM 2019 fue informada por la DGEU mediante of. Núm. 511/2019-0276 con fecha 18/feb/19. A partir de esa fecha se iniciaron los trámites ante el Gobierno del Estado para la radicación de las ministraciones a la UV. Los recursos ya fueron radicados en su totalidad de acuerdo a las ministraciones mensuales.								
3	Construcción 2da. Etapa de módulo de aulas en la Facultad de Arquitectura, región Poza Rica	X				\$ 14,710,000.00	\$ 14,709,047.41	\$ 952.59	Aula 3 193.50 Taller 4 460.62 Biblioteca 1 93.92 Administración 1 264.25 Auditorio 1 109.80 Área común 1 376.98	Obra concluida		100	18/09/19	05/02/20									
4	Programa Anual de Mantenimiento Institucional		X			\$ 2,783,094.35	\$ 2,729,889.51	\$ 53,204.84	XALAPA: DES Biol. Agropecuarias y Humedades (aménarios, pintura) VERACRUZ: Transversal (int. eléctrica) CÓRDOBA: DES C. Salud (pintura, aparatos, malla, ítem, e ítem.) COATZACOALCOS: DES C. Biol Agrop (pintura, ítem, ítem)	Obra concluida		100	24/06/19	10/01/20									
5	Equipamiento para el laboratorio, aula y centro de cómputo en la Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación, región Veracruz.	X				\$ 439,000.00	\$ 360,235.90	\$ 77,764.10	Videoproector 3 Mesa para computadora 50	Obra concluida		100	08/07/19	21/08/19									
6	Equipamiento para el Foro del Centro Cultural "Casa del Lago UV", región Xalapa	X				\$ 751,000.00	\$ 750,382.00	\$ 618.00	Blizzard Pipeline 1 Strand Lighting 8 ETC Source Four Led 8 Clamps 16	Obra concluida		100	15/12/19	09/01/20									
						\$26,432,694.35	\$26,299,328.41	\$132,773.94															

Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

¹ Se caracterizará los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tantas fotos como sea necesario.
² En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
³ Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: día, mes y año.

2019

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

marzo_2020

FECHA DE CORTE: 31/03/2020

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

1 Nombre de la obra:

Implementación de tecnologías que permitan el ahorro de energía y consumo de agua, así como construcción de cisterna y biodigestores en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, región Xalapa




Universidad Veracruzana

Porcentaje de avance


100%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CALLE PASO No. 112, LOTE II SECC. 2A. LETRA B, COL. DESARROLLO HABITACIONAL NUEVA XALAPA, XALAPA VER.



F1: Iluminación en entrada principal de la FCAS



F2: Iluminación exterior con fotoceldas

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra concluida



F3: Sustitución de Sistema hidroneumático por tinacos



F4: Vista de cisterna de aguas pluviales



F5: Vista del área de los Biodigestores para tratamiento de aguas residuales

[Signature]
Dr. Sara C. León de Olivares González

Nombre y firma del Titular de la IES

M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado



marzo_2020

FECHA DE CORTE: 31/MAR/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

2 Nombre de la obra: **Continuación de la construcción del edificio para la Facultad de Matemáticas, de Física y el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial, región Xalapa**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

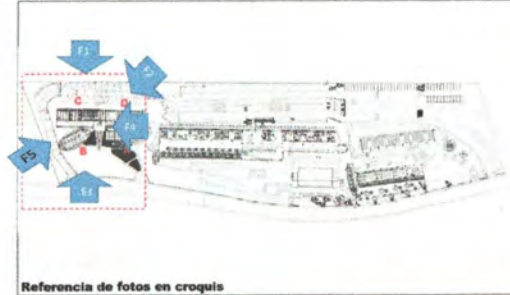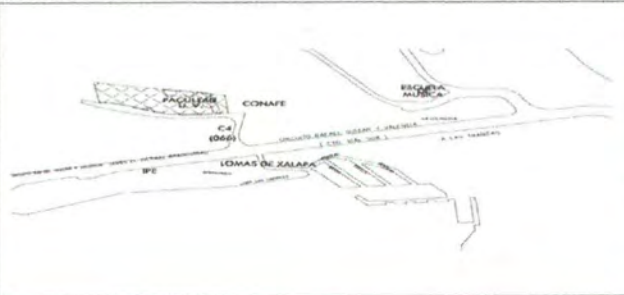

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CALLE PASO No. 112, LOTE II SECC. 2A, LETRA B, COL. DESARROLLO HABITACIONAL NUEVA XALAPA, XALAPA VER.

Referencia de fotos en croquis



Universidad Veracruzana

Porcentaje de avance

100%

Comentarios de los trabajos realizados:

Etapa de obra concluida



F1: Edificio (C) limpieza



F2: Cimentación Escaleras



F3: Cimentación Rampas de acceso



F4: Rampas de escaleras



F5: Cubiertas edificio C

[Handwritten signature]
Dra. Sara D. Leal de Cervera González

Nombre y firma del Titular de la IES

[Handwritten signature]
M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
marzo_2020
FECHA DE CORTE: 31/03/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance
100%

3 Nombre de la obra: **Construcción 2da. Etapa de módulo de aulas en la Facultad de Arquitectura, región Poza Rica**



F1: Fachada norte (planta baja y primer nivel).



F2: Fachada este (planta baja y primer nivel)

Comentarios de los trabajos realizados:
Obra concluida



F3: Fachada Sur (planta baja)



F4: Fachada Oeste (planta baja y primer nivel)



F5: Interior (planta baja)

Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ENTENDIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
marzo_2020
FECHA DE CURTI: FEBRERO

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

4 Nombre de la obra: **Programa Anual de Mantenimiento Institucional Xalapa: Mantenimiento General en la Unidad Académica de Biológico-Agropecuarias**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de foto:

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CIRCUITO AGUIRRE BELTRAN SIN ZONA UNIVERSITARIA, XALAPA, VER.



Universidad Veracruzana

www.uv.mx

Porcentaje de avance

100%



F1: Vista de acceso principal



F2: Vista de andador interior

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra concluida



F3: Vista de andador interior



F4: Vista de andador interior



F5: Vista de andador interior

Nombre y firma del Titular de la IES

D. C. Saúl D. Barón de Guaymas González

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

M. Arq. Emilia P. Rodas Juárez

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

2020

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

marzo_2020

FECHA DE CORTE: 31/03/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

4 Nombre de la obra: Programa Anual de Mantenimiento Institucional Xalapa: Mantenimiento General en el Instituto de Investigaciones Histórico Sociales

CIRCUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de:

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



DIEGO LEÓN ESG. MANUEL DOBLADO NO. 8 COL. CENTRO, XALAPA, VER.



Universidad Veracruzana

Porcentaje de avance

100%

FOTOS



F1: Vista de patio interior



F2: Vista de patio interior

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra concluida



F3: Vista de vestíbulo de planta alta



F4: Vista de vestíbulo de planta baja



M. Arq. Enríke P. Rodiles Jato

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

D.º Sr. Juan de Dios González

Nombre y firma del Titular de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestalla, se podrán copiar tantas pestallas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO

FAM
FONDO DE FORTALECIMIENTOS MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
marzo_2020
FECHA DE CORTE: 31/MARZO

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Universidad Veracruzana

Porcentaje de avance

100%

4 Nombre de la obra: Programa Anual de Mantenimiento Institucional Veracruz: Centro de Estudios y Servicios en Salud

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

Referencia de fotos en croquis



Plano Baja



1er Nivel

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



TURBIDE ESQ. SERDÁN CCL. FLORES MAGÓN, VERACRUZ, VER.



F1: Vista tableros junto a transformador



F2: Líneas eléctricas por azotea

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra concluida



F3: Revisión de tableros de control



F4: Líneas eléctricas en azotea



F5: Líneas eléctricas por azotea



Nombre y firma del Titular de la IES


M. Anq. Emilio P. [Illegible]

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial: se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCION DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Mes reportado
marzo_2020
FECHA DE CORTE: 31/MARZO/2020

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Universidad Veracruzana

Porcentaje de avance

100%

4

Nombre de la obra:

Programa Anual de Mantenimiento Institucional Córdoba: Instituto de Psicología y Educación Especial de Córdoba

CROQUIS DE LOCALIZACION

Referencia de zonas en croquis



UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO



CALLE 3 ENTRE AV. 34 Y CALLE 42 COL. NUEVO TOXIFAN
CORDOBA, VER.



F1: Fachada Edificio C



F2: Fachada Edificio A

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra concluida



F3: Impermeabilización Edificio B



F4: Exteriores junto a Edificio A

Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IE:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestana, se podrán copiar tantas pestanas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y hazar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
marzo_2020
FECHA DE CORTE: 31MAR2020

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Universidad Veracruzana

Porcentaje de avance

100%

4 Nombre de la obra: Programa Anual de Mantenimiento Institucional Córdoba: Instituto de Psicología y Educación Especial de Orizaba

CROQUIS DE LOCALIZACION

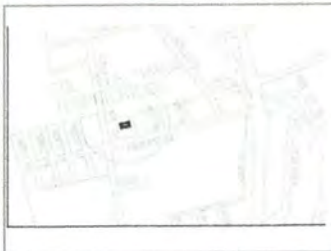

Referencia de todos en croquis



UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO



PRIVADA NORTE 15 LOTE N.UM 77 COL. STA. MARIA TLACHICILCO, ORIZABA, VER.



F1: Azotea



F2: Canales y cubierta planta alta

Comentarios de los trabajos realizados:


Obra concluida



F3: Estado del impermeabilizante



F4: Fachada principal

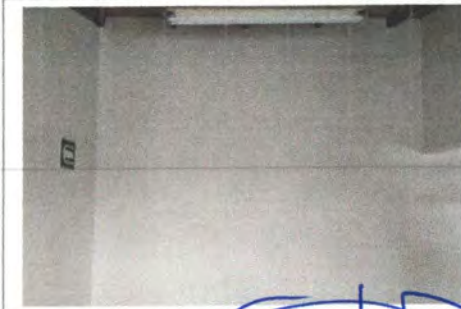

F5: Interior estado actual pintura



Nombre y firma del Titular de la IES


M. Anq. Emilio P. Rodas Jasso

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IE:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestañita, se podrán copiar tantas pestañitas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCION DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Mes reportado
marzo_2020

FECHA DE CORTE: 31/MAR/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Universidad Veracruzana

Porcentaje de avance


100%

4

Nombre de la obra:

Programa Anual de Mantenimiento Institucional Coatzacoalcos-Minatitlán: Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria

CRUCIOS DE LOCALIZACION



Referencia de fotos en croquis



UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO



CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM 220, (ACATUCAN CATEMACO) SAN COL. AGRICOLA Y GANADERA MICHAPEAN, ACATUCAN VER.



F1: Vista Sur azotea edificio A



F2: Vista Oeste azotea edificio A

Comentarios de los trabajos realizados:
Obra Terminada



F3: Vista Oeste azotea edificio A



F4: Fachada posterior edificio A



F5: Fachada principal edificio A

Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

M. Ang. Emilio P. Ruelas Jasso

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestiña, se podrán copiar tantas pestiñas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
marzo_2020
FECHA DE CORTE: 31 MAR 2020

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Universidad Veracruzana
FUNDACIÓN DE INVESTIGACIONES

Porcentaje de avance
100%

5 Nombre de la obra: **Equipamiento para el laboratorio, aula y centro de cómputo en la Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación, región Veracruz.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



AV. MAR DE NORTE ESQ. REYES HEROLES, FRACC. COSTA VERDE, BOCA DEL RIO, VER.



F1: Cubículos



F2: Mobiliario para Cubículos

Comentarios de los trabajos realizados:
Obra concluida




F3: Aula de posgrado



F4: Mobiliario para aula



F5: Mobiliario para aula


Nombre y firma del Titular de la IES


Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
marzo_2020
FECHA DE CORTE: 31/MARZO/2020

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Universidad Veracruzana

Porcentaje de avance

100%

6 Nombre de la obra: **Equipamiento para el Foro del Centro Cultural "Casa del Lago UV", región Xalapa**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



BELISARIO DOMÍNGUEZ No. 25 COL. CENTRO, XALAPA VER



F1: Pasagatos lateral sobre muro de coincidencia



F2: Vista general de pasagatos

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra concluida



F3: Vista interior muro lateral de coincidencia



F4: Vista exterior del foro



F5: Pasagatos posterior a pasagatos

Dr. Eduardo Lozano de Cuervo González

Nombre y firma del Titular de la IES

M. Arq. Emilia P. Rodríguez

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
marzo_2020

FECHA DE CORTE: 31/03/2020

AÑO

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES REMANENTES RENDIMIENTOS FINANCIEROS

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Universidad Veracruzana

Porcentaje de avance

100%

1 Nombre de la obra: **Conectividad de voz y datos en el área de expedientes y archivo del 2º nivel edificio D, Unidad Central, región Xalapa, complemento de recursos**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO




Referencia de fotos en croquis

CIRCUITO GONZALO AGUIRRE BÉSTIBAN EN LOMAS DEL ESTADIO, ZONA UNIVERSITARIA, XALAPA, VER.




F1: Fachada principal

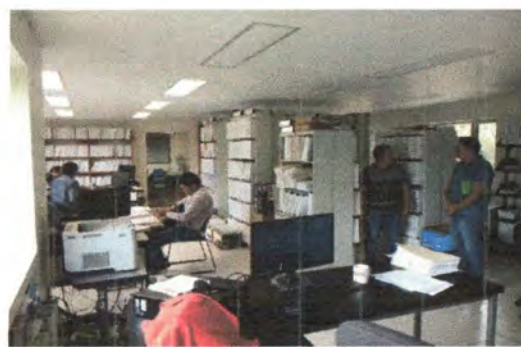

F2: Vista interior

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra concluida

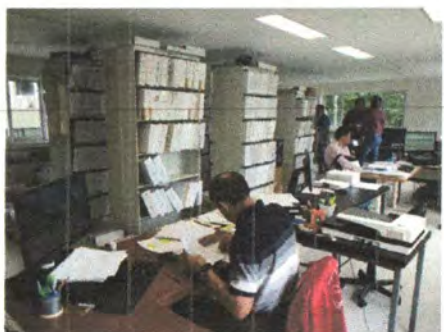

F3: Vista interior



F4: Vista interior

Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES REMANENTES RENDIMIENTOS FINANCIEROS

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado:

marzo_2020

FECHA DE CORTE: 31/MAR/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

2 Nombre de la obra: **Rehabilitación de las escaleras de acceso principal a la Unidad Central, región Xalapa, complemento de recursos 2**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CIRCUITO GONZALO AGUIRRE RESTRAN EN LOMAS DEL ESTADIO, ZONA UNIVERSITARIA, XALAPA, VER.



Universidad Veracruzana

Porcentaje de avance

100%



F1: Escalera 1



F2: Escalera 2

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra concluida



F3: Escalera 3



F4: Escalera 4



Dra. Sil D. Cadón de Guayra Gofcaz

Nombre y firma del Titular de la IES

M. Arq. Emilio P. Rodas Justo

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2019

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES REMANENTES RENDIMIENTOS FINANCIEROS

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado:

marzo_2020

FECHA DE CORTE: 31/MAR/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Universidad Veracruzana



Porcentaje de avance

100%

3 Nombre de la obra:

Construcción de cubierta para la planta de tratamiento de aguas residuales en la Dirección General de Investigaciones, región Xalapa, complemento de recursos

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

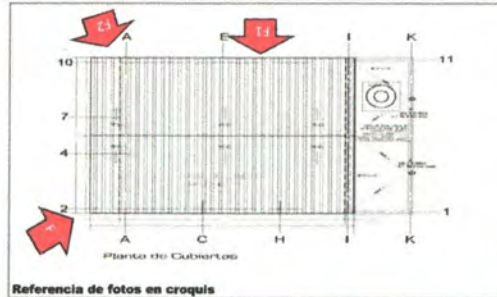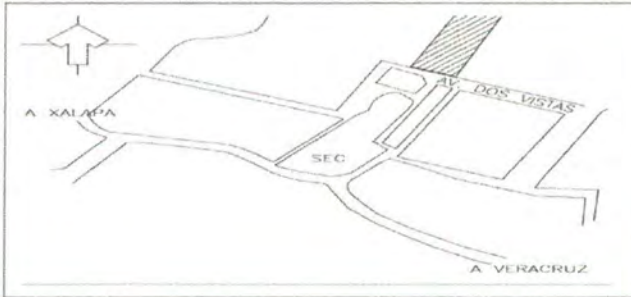

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



F1: Vista frontal de la planta de tratamiento



F2: Vista posterior de la planta de tratamiento

Comentarios de los trabajos realizados:


Obra concluida



F3: Escalera 3



Nombre y firma del Titular de la IES



Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES REMANENTES RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Mes reportado

marzo_2020

FECHA DE CORTE: 31/03/2020

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Universidad Veracruzana

Unidad de Ingeniería



Porcentaje de avance

0%

4 Nombre de la obra:

Construcción de cafetería y 2a. Etapa de estacionamiento en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura, región Poza Rica-Tuxpan, complemento de recursos

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

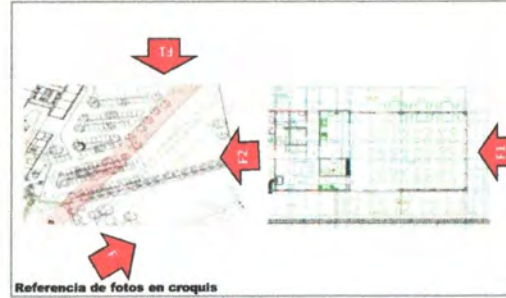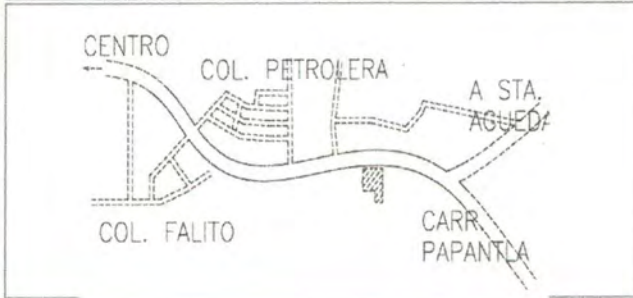

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



F1: Vista del estacionamiento



F2: Vista del estacionamiento

Comentarios de los trabajos realizados:
Obra por iniciar



F3: Vista del estacionamiento



F4: Vista de la cafetería actual

[Signature]
Dra. Sara D. Muñoz de Guzmán González

Nombre y firma del Titular de la IES

[Signature]
M. Arq. Emilia P. Romero Salas

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2019

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES REMANENTES RENDIMIENTOS FINANCIEROS

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
marzo_2020

FECHA DE CORTE: 31/MAR/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Universidad Veracruzana

Porcentaje de avance



0%

5

Nombre de la obra:


Construcción de cafetería y 2a. Etapa de estacionamiento en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura, región Poza Rica-Tuxpan, complemento de recursos 2

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

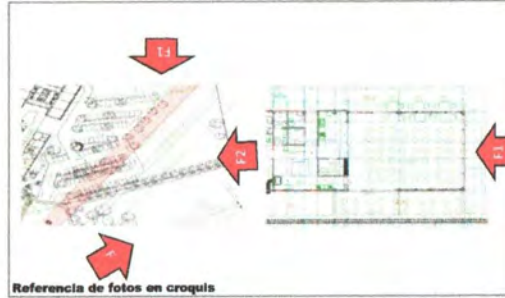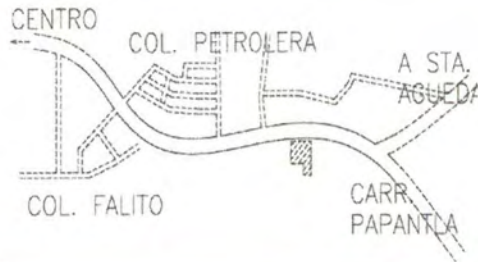

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

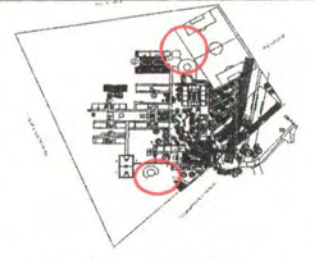

CARRETERA POZA RICA PAPANTLA, COL. HALLIBURTON ANTES GUADALUPE VICTORIA, POZA RICA, VER.



F1: Vista del estacionamiento



F2: Vista del estacionamiento



F3: Vista del estacionamiento



F4: Vista de la cafetería actual

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra por iniciar

Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.
