

2020

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
marzo_2020
FECHA DE CORTE: 31/MAR/2020

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: **Universidad Veracruzana**

Entidad Federativa: Veracruz

Clave Inst 911: 30MSLU08408



Universidad Veracruzana

Escudo de la institución

Nombre: Dra. Laura Martínez Márquez
Cargo: Directora de Planeación Institucional
Teléfono: (01228) 8421700 EXT. 12718
Correo electrónico: lmartinez@uv.mx

RESPONSABLES

Nombre: M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo
Cargo: Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento
Teléfono: (01228) 8421700 EXT. 12702
Correo electrónico: erodiles@uv.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
		Obras de infraestructura	Equipamiento	Adquisiciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto tecnológico	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Termino	Entrega- Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción	Monto de Acta Administrativa	
																							¿Cuenta con fotos del evento?
1	Conclusión del Edificio para la Facultad de Matemáticas, de Física y el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial, región Xalapa	X				\$ 26,000,000.00	\$ -	\$ 26,000,000.00	Aulas	17	906.00	Obra por iniciar	Convocatoria para licitación	0	15/05/20	30/11/20	La asignación de recursos del FAM 2020 fue informada por la DGEJU mediante of. Núm. 511/2020-0845-60 con fecha 13/feb/20. La reprogramación de obras del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2020 fue autorizada mediante oficio No. 511/2020-1286 de fecha 18 de marzo de 2020. A partir de esa fecha se iniciaron los trámites ante el Gobierno del Estado para la radicación de las ministraciones a la LUV los cuales se encuentran en proceso, de acuerdo al calendario de ministraciones mensuales.						
									Talleres	1	36.00												
2	Programa de Mantenimiento Institucional	X				\$ 7,584,997.00	\$ -	\$ 7,584,997.00	laboratorios	14	1102.00	Obra por iniciar	Revisión de presupuesto para adjudicación	0	01/05/20	30/08/20							
									Cubículos	67	1105.00												
									Biblioteca	1	238.00												
									Oficinas administrativas	23	358.00												
									Centro de cómputo	3	234.00												
									Sala de usos múltiples	1	170.00												
									Aula didáctica	2	57.00												
									Sanitarios	5	200.00												
									Áreas comunes	1	1150.00												
									Otros	3	168.00												
									TOTAL	138	8727.96												
									XALAPA DES Económico Administrativo (Fac. de Contaduría y Administración)		375.00												
									XALAPA DES Técnicos (Fac. de Arquitectura)		250.00												
									TOTAL		625.00												
					\$33,584,997.00	\$0.00	\$33,584,997.00																

Dra. Laura Martínez Márquez
Nombre y firma del Titular de la IES

M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

¹ Se capturarán las especificaciones que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tantas filas como sea necesario.
² En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
³ Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2020

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE PORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

marzo_2020

FECHA DE CORTE: 31/MAR/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

1

Nombre de la obra:

Conclusión del Edificio para la Facultad de Matemáticas, de Física y el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial, región Xalapa





Universidad Veracruzana

Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

0%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

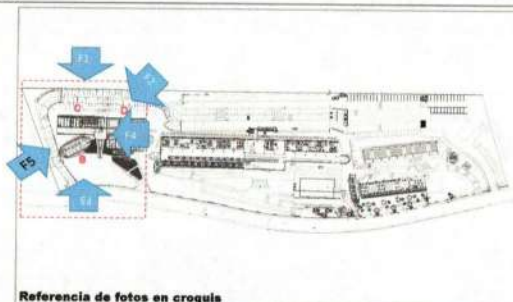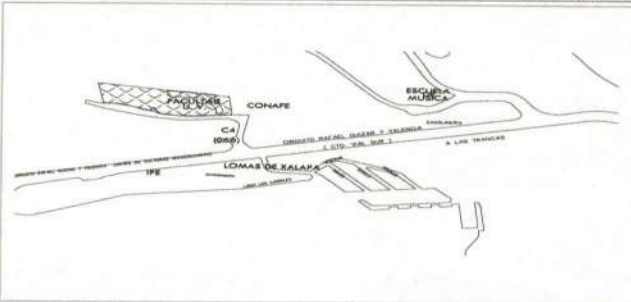

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CALLE PASEO No. 112, LOTE II SECC. 2A. LETRA B, COL. DESARROLLO HABITACIONAL NUEVA XALAPA, XALAPA, VER.

FOTOS



F1: Edificio (C) lateral



F2: Escaleras

Comentarios de los trabajos realizados:

Etapa de obra por iniciar proceso de licitación



F3: Rampas de acceso



F4: Rampas de escaleras



F5: Edificio C y D.

Sara D. López de Guevara González

Nombre y firma del Titular de la IES

M. Arq. Emilia P. Rodiles Castro

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
marzo_2020
FECHA DE CORTE: 31/03/2020


REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PROYECTO

2

Nombre de la obra: **Programa de Mantenimiento Institucional: Mantenimiento integral al Auditorio de la Facultad de Contaduría y Administración región Xalapa**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

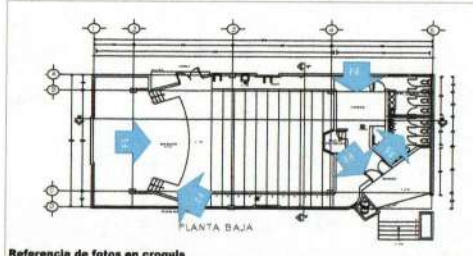

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CIRCUITO AGUIRRE BELTRÁN SIN ZONA UNIVERSITARIA, XALAPA, VER.



Universidad Veracruzana

Escuela de la universidad

Porcentaje de avance

0%

FOTOS



F1: Vista principal de butacas



F2: Vista de foro

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra por iniciar



F3: Vista de acceso



F4: Vista de pasillo inferior



F5: Vista de servicio

Dra. Sara D. Lidia de la Cruz Guzmán

Nombre y firma del Titular de la IES

M. Art. Enría P. Rodas Jato

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

marzo_2020

FECHA DE CORTE: 15/03/2020


REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIMORDIO

2

Nombre de la obra: Programa de Mantenimiento Institucional: Mantenimiento integral al Auditorio de la Facultad de Arquitectura región Xalapa

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CIRCUITO AGUIRRE BELTRÁN SIN ZONA UNIVERSITARIA, XALAPA, VER.



Universidad Veracruzana

Porcentaje de avance

0%

FOTOS



F1: Vista de acceso



F2: Vista de foro

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra por iniciar



F3: Vista de butacas



F4: Vista de cabina



F6: Vista de pasillo

Dra. Erika D. López de Guzmán

Nombre y firma del Titular de la IES

M. Arq. Erika P. Rodas

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
