

2020

FAM


FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAMM) - PERMANENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Más reportado
septiembre_2020
FECHA DE CORTE: 30/09/2020

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL


DATOS DE LA UNIVERSIDAD


 Universidad Veracruzana	Nombre: Universidad Veracruzana Entidad Federativa: Veracruz Clave PIS 011: 208400408			
	Responsable: <table border="1"> <tr> <th>Planeación</th> <th>Obras y Mantenimiento</th> </tr> <tr> <td> Nombre: Cra. Laura Martínez Márquez Cargo: Directora de Planeación Institucional Teléfono: 501226 8421700 EXT. 12716 Correo electrónico: lmar20@uv.mx </td> <td> Nombre: M. Arq. Erika P. Rojas Jasso Cargo: Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento Teléfono: 601226 8421100 EXT. 13163 Correo electrónico: erogas@uv.mx </td> </tr> </table>	Planeación	Obras y Mantenimiento	Nombre: Cra. Laura Martínez Márquez Cargo: Directora de Planeación Institucional Teléfono: 501226 8421700 EXT. 12716 Correo electrónico: lmar20@uv.mx
Planeación	Obras y Mantenimiento			
Nombre: Cra. Laura Martínez Márquez Cargo: Directora de Planeación Institucional Teléfono: 501226 8421700 EXT. 12716 Correo electrónico: lmar20@uv.mx	Nombre: M. Arq. Erika P. Rojas Jasso Cargo: Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento Teléfono: 601226 8421100 EXT. 13163 Correo electrónico: erogas@uv.mx			

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

CIBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Reservante	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fecha ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
		Obra de construcción	Equipamiento	Asignaciones y mejoras	Proyecto administrativo				Estadísticas	Infraestructura	Metros cuadrados				Inicio	Termino			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega- Recepción (Acta Inicial)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción	Monto de Acta Administrativa
GLOBAL DEL PROYECTO																							
1	Conclusión de espacio para aula de la LENA, campus Coatzacoacoas	X				\$ 344,236.30	\$ -	\$ 344,236.30	Aula	1	108	Obras por iniciar	En proceso de contratación	0	15/10/20	30/12/20	El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEDF/PLAN) notificó a la Universidad Veracruzana la asignación de recursos del FOM 2020 referente a la contratación mediante el ex. SPP/1622/2020 de fecha 16/Jan/2020 por \$7,174,236.30. Los recursos ya fueron radicados a la Universidad Veracruzana.						
2	Laboratorio de innovación tecnológica Convenio Microsoft-UV-Gob. Federal en la USBI, región Xalapa		X			\$ 1,130,000.00	\$ -	\$ 1,130,000.00	Laboratorio	1	142	Obras por iniciar	En proceso de contratación	0	15/10/20	30/12/20							
3	Continuación del mantenimiento del Foro Abierto "Miguel Vázquez" del Centro Cultural Casa del Lago, región Xalapa			X		\$ 250,000.00	\$ -	\$ 250,000.00	Foro	1	270	Obras por iniciar	En proceso de contratación	0	15/10/20	30/12/20							
4	Cubierta del patio central de la Dirección General de Difusión Cultural, región Xalapa	X				\$ 1,300,000.00	\$ -	\$ 1,300,000.00	Patio central	1	397	Obras por iniciar	En proceso de contratación	0	15/10/20	30/12/20							
5	Reforzamiento de estructura metálica por sismo del edificio "B" en las Facultades de Matemáticas, Física y el Centro de Investigaciones en Inteligencia Artificial, campus Sur, región Xalapa	X				\$ 1,400,000.00	\$ -	\$ 1,400,000.00	Edificio	1	1259	Obras por iniciar	En proceso de contratación	0	15/10/20	30/12/20							
6	Adaptación de espacios en la USBI Mocambo para aulas de capacitación China-Veracruz, región Veracruz		X			\$ 369,000.00	\$ -	\$ 369,000.00	Aulas Cubierta Pasillo	2 1 1	117 9 16	Obras por iniciar	En proceso de contratación	0	15/10/20	30/12/20							
7	Adopasto en estacionamiento y cubierta de acceso en las Facultades de Matemáticas, Física y el Centro de Investigaciones en Inteligencia Artificial, campus Sur, región Xalapa	X				\$ 2,370,000.00	\$ -	\$ 2,370,000.00	Obras educar	1	1060	Obras por iniciar	En proceso de contratación	0	15/10/20	30/12/20							
						\$7,174,236.30	\$0.00	\$7,174,236.30															


Nombre y firma del Titular de la IES


Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

¹ Se incluye por separado los contratados, a la obra o servicio. Se incluye en el ítem Btu, como sus requisitos.
² Por cada acción se registra la fecha de inicio y término de la misma, además de los datos relativos al evento correspondiente.
³ Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en sus dígitos: día, mes y año.

2020

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES RENOVANTE

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
septiembre_2020
FECHA DE CORTE: 30/09/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Porcentaje de avances

0%


1 Nombre de la obra: **Conclusión de espacio para aula de la LENA, campus Coatzacoalcos**

ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN

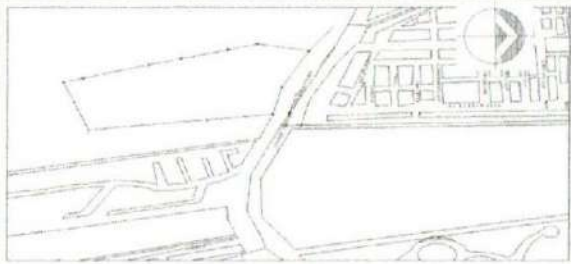

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



AV. UNIVERSIDAD SAN CARRETERA A MINATITLÁN KM. 7.5
COATZACOALCOS VER.

FOTOS



F1:



F2:

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra por iniciar



F3:



F4:



F5:

[Signature]
Nombre y firma del Titular de la IES

M. Arq. Enkle P. Rojas Lobo
[Signature]
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se envíe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES RENOVABLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL/CLAYTON DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MES PRESENTADO
septiembre_2020
PERIODO CUOTE: 367070103

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Universidad Veracruzana

Porcentaje de avance

0%

PROYECTO 2 Nombre de la obra: **Laboratorio de Innovación tecnológica Convocado Microsoft- UV-Gob. Federal en la USBI, región Xalapa**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO



AVENIDA DE LAS CULTURAS VESPERALANAS NO. 1 COL. MARTINES DE CHICAGO, XALAPA, VER.

FOTOS



P1: Vista interior 1



P2: Vista interior 2

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra por iniciar



P3: Vista interior 3



P4: Vista del acceso



P5: Vista interior 4

Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se envíe reporte fotográfico de todos los obras. Para ello se anexa una plantilla, se podrán copiar tantas plantillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial: se recomienda que se capture la misma forma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

FAM

FONDO DE FORTALECIMIENTO MULTIPLES ASIGNANTE

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL, DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
septiembre_2020
FOLIO DE FONTO: 38789/2020

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Universidad Veracruzana

Porcentaje de avance



0%

3

Nombre de la obra:


Continuación del mantenimiento del Foro Abierto "Miguel Vélaz" del Centro Cultural Casa del Lago, región Xalapa

ENQUIS DE LOCALIZACION



Referencia de fotos en croquis

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO



DELEGADO COMISARIZADO 25 COL. CENTRO, XALAPA, VER.

FOTOS



F1: Vista de la superficie del foro abierto



F2: Estado actual de la estructura

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra por iniciar



F3: Estado actual rehabilitación de cubierta



F4: Estado actual cubierta foro abierto



F5: Vista del foro desde el parque del lago

Nombre y firma del Titular de la EIS

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento

* Es muy importante que se anexa reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pastafila, se podrán copiar tantas pastafilas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y educaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES RESERVANTE

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
septiembre_2020
FOLIO DE CONTROL 3870/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Universidad Veracruzana

Porcentaje de avance



0%

4

Nombre de la obra:

Cubierta del patio central de la Dirección General de Difusión Cultural, región Xalapa

CRONOGRAMA DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO



J. ARETANA SI COL. CENTRO, XALAPA, VER.

FOTOS



F1: Vista desde arriba 1



F2: Vista desde planta alta 1

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra por iniciar



F3: Vista desde planta alta 2



F4: Vista desde arriba 2



F5: Vista general del patio central


Nombre y firma del Rector de la ES


Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la ES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todos los obra. Para ello se anexa una planilla, se podrán copiar tantas planillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en su defecto, se recomienda que se capture la misma tema, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES RENOVANTE

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado: **septiembre_2020**
FECHA DE CORTE: 30/09/2020



REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Universidad Veracruzana

Porcentaje de avance
0%

PROYECTO 5 Nombre de la obra: **Reforzamiento de estructura metálica por sismo del edificio "B" en las Facultades de Matemáticas, Física y el Centro de Investigaciones en Inteligencia Artificial, campus Sur, región Xalapa**
CIRCUITO DE LOCALIZACIÓN

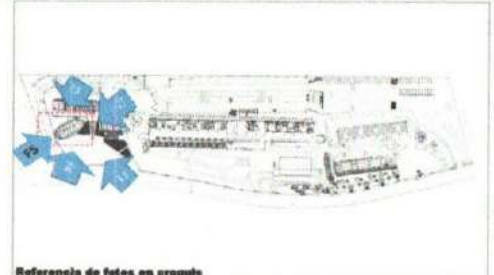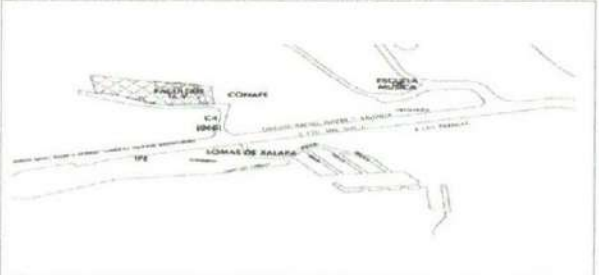

Referencia de fotos en croquis



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

FOTOS




P1: VISTA GENERAL



F2: Escaleras

Comentarios de los trabajos realizados:
Etapa de obra por iniciar

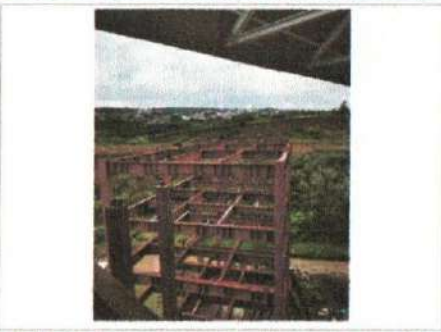

F3: VISTA GENERAL



F4: VISTA GENERAL



F5: VISTA GENERAL

Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestana, se podrán copiar tantas pestanas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERTARIA
DIRECCIÓN DEL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
septiembre_2020
PÁGINA DE COSTO SEPTIEMBRE

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Universidad Veracruzana

Porcentaje de avance

0%

Nombre de la obra: **Adaptación de espacios en la USBI Mecambo para aulas de capacitación China- Veracruz, región Veracruz**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

Refuerzo de fotos en croquis

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

AV. 52 JUAN PABLO ENTRE BLVD ADOLFO RAZ CURTINES Y JESUS REYES HERCULES, FRACC. COSTA VERDE, BOCA DEL RIO, VER.

FOTOS




F1



F2

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra por iniciar

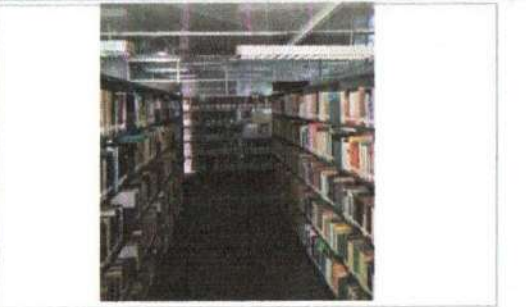

F3



F4



F5

Nombre y firma del Titular de la ES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la ES

* Es muy importante que se anexe repertorio fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para sí antes, durante y después de la obra.

2020

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES REMUNERATIVAS

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
septiembre 2020
FECHA DE CORTE: 30/09/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL





Universidad Veracruzana

Porcentaje de avance

0%

PROYECTO: **7** Nombre de la obra: **Adopsto en estacionamiento y subierta de acceso en las Facultades de Matemáticas, Física y el Centro de Investigaciones en Inteligencia Artificial, campus Sur, región Xalapa**

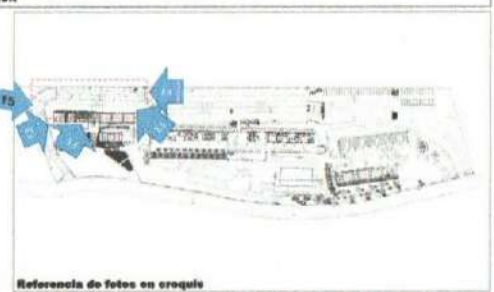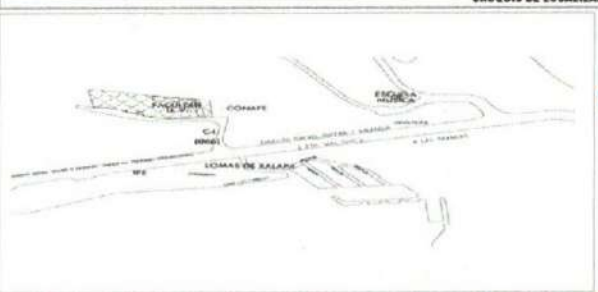

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CALLE PARED No. 112, LOTE 4 SECC. 2A, LETRA B, COL. DESARROLLO HABITACIONAL NUEVA XALAPA, XALAPA, VER.

FOTOS:



F1: VISTA GENERAL



F2: Escaleras

Comentarios de los trabajos realizados:
Etapa de obra por iniciar



F3: VISTA GENERAL



F4: VISTA GENERAL



F5: VISTA DE ACCESO

Dr. David Rodríguez Quiroz

Nombre y firma del Titular de la IES

M. Aq. Enita P. Rodríguez

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
