

2020

**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES FINANCIEROS

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado:  
**diciembre\_2020**  
FECHA DE CONFORMACIÓN

**REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL**

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: **Universidad Veracruzana**

Entidad Federativa: **Veracruz**

Código postal: **91100**

Nombre: **Dra. Laura Martínez Márquez**  
Cargo: **Directora de Planeación Institucional**  
Teléfono: **(01228) 8421700 EXT. 12718**  
Correo electrónico: **lmartinez@uv.mx**

RESPONSABLES

Planeación

Obras y Mantenimiento

Nombre: **M. Ana Emma P. Rodas Arce**  
Cargo: **Coordinadora de Proyectos, Construcción y Mantenimiento**  
Teléfono: **(01228) 8421700 EXT. 12702**  
Correo electrónico: **arodas@uv.mx**

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA C ONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>			Acciones que sustentan el avance <sup>2</sup>	Acciones por realizar	% de avance	Fechas <sup>3</sup>		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas					
		Obras de construcción	Equipamiento	Adquisiciones y mobiliario	Mantenimiento				Proyecto sustantivo	Reparación/obras	construcción				metros cuadrados	Inició			Terminó	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Ordén y cuándo inauguró?	Entrega- Recepción (Acta finalizado)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción	Monto de Acta Administrativa		
	<b>Trabajos complementarios para poner en operación el edificio del Centro de Investigaciones Biomédicas, región Xalapa (complemento de recursos)</b>	X				\$ 180,517.74	\$ -	\$ 180,517.74	Trabajos complementarios	1	685	Obras concluidas	Transferir Incaute	100	21/12/20	30/12/20	El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFINPLA) realizó a la Universidad Veracruzana la asignación de recursos del FAM 2020 Rendimiento Financiero, mediante el No. OFP/1504/2020 de fecha 09/05/2020 por \$180,517.74. Los recursos ya fueron recibidos a la Universidad Veracruzana.									
						<b>\$180,517.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$180,517.74</b>																		

Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1. Se clasifica los proyectos que intervienen a la obra o resultado. Se deberá indicar cómo fue el avance del proyecto.  
2. En esta sección se detallan de forma breve y sucinta las acciones a realizar, incluso que se estén realizando en el momento de reportar.  
3. Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en año, día, mes y año.

2020

# FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES RENDIMIENTOS FINANCIEROS

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA,  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL,  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado:  
**diciembre\_2020**  
FISCALÍA DE CUENTAS, VERACRUZ

### REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Universidad Veracruzana


Porcentaje de avance

# 100%

1 Nombre de la obra: **Trabajos complementarios para poner en operación el edificio del Centro de Investigaciones Biomédicas, región Xalapa (complemento de recursos)**



CRONOGRAMA DE LOCALIZACIÓN

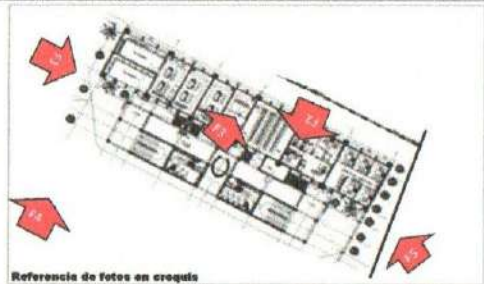

Referencia de fotos en croquis



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CIRCUITO VERACRUZ No 3 COL. INDUSTRIAL ANIMAS, XALAPA, VER.

### FOTOS



F1



F2

Comentarios de los trabajos realizados:  
  
Obra concluida



F3



F4



F5

Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra
