

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad Veracruzana  
Entidad federativa: Veracruz  
Código del IES: 3046100400

Nombre: Msc. Norma Angélica Lagunes López  
Cargo: Encargada de la Dirección de Planeación Institucional  
Teléfono: (01229) 8431700 EXT. 12716  
Correo electrónico: nlagunes@uv.mx

RESPONSABLES

Nombre: M. Anq. Emilia P. Rodiles Justo  
Cargo: Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento  
Teléfono: (01229) 8421700 EXT. 12702  
Correo electrónico: erodiles@uv.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>			Acciones que sustentan el avance <sup>2</sup>	Acciones por realizar	% de avance	Fecha <sup>3</sup>		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurado? (Causas)	Si ya fue inaugurado		Cuerlla con Actas			
		Obra de infraestructura	Equipamiento	Administración y mejoras	Rehabilitación				Proyecto sustantivo	Espacio/metro cuadrado	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Termino	¿Cuent a con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega- Recepción (Acta finalizado)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción	Monto de Acta Administrativa
<b>GLOBAL DEL PROYECTO</b>																								
1	Za. etapa de rehabilitación del Centro de Estudios y Servicios en Salud, región Veracruz	X				\$ 852,709.86	\$ 852,709.86	\$ -	Módulo de Salud	1	712.00	Otra concluida		100	2/05/18	15/06/19		Si	Rectora Dra. Sara D. León de Guzmán González, 19/11/19	Si	Si	852,709.86		
2	Trabajos complementarios de obra eléctrica y aire acondicionado en el CESS, región Veracruz	X				\$ 725,914.36	\$ 725,914.36	\$ -	Módulo de Salud	1	712.00	Otra concluida		100	2/05/18	15/06/19		Si	Rectora Dra. Sara D. León de Guzmán González, 19/11/19	Si	Si	725,914.36		
3	Construcción de espacios educativos en el edificio "B" de las Facultades de Matemáticas y de Física, región Xalapa		X			\$ 890,505.75	\$ 890,505.75	\$ -	Aulas	2	298.68	Otra concluida		100	2/03/20	15/04/20		No		Si	Si	890,505.75		
4	Conclusión de 2 aulas en la Facultad de Matemáticas, región Xalapa	X				\$ 188,118.78	\$ 188,118.78	\$ -	Aulas	2	139.53	Otra concluida		100	10/07/13	23/08/13		No		Si	Si	188,118.78		
5	Construcción de subestación eléctrica en las Facultades de Matemáticas y de Física, región Xalapa		X			\$ 941,572.77	\$ 941,572.77	\$ -	Subestación	1	5.00	Otra concluida		100	15/12/19	15/03/20		No		Si	Si	941,572.77		
6	Construcción de cafetería y 3a. Etapa de estacionamiento en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura, región Poza Rica-Tuxpan	X				\$ 3,794,067.89	\$ 3,794,067.89	\$ -	Cafetería Estacionamiento TOTAL	1 1 2	275.00 1,382.00 1,657.89	Otra concluida	Transferir fondos	100	20/10/20	11/02/21		Si	Rectora Dra. Sara D. León de Guzmán González, 08Jun/21	Si	Si	3,794,067.89		
7	Continuación de la construcción del edificio para la Facultad de Matemáticas, de Física y el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial, región Xalapa, complemento de recursos	X				\$ 3,788,121.71	\$ 3,788,121.71	\$ -	Laboratorio Oficinas Área común TOTAL	1 6 5 12	43.83 351.46 288.17 683.46	Otra concluida		100	29/05/20	3/01/21		Si	Rectora Dra. Sara D. León de Guzmán González, 16Jun/21	Si	Si	3,788,121.71		
8	Continuación de la construcción del edificio para la Facultad de Matemáticas, de Física y el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial, región Xalapa, complemento de recursos 2	X				\$ 9,399,335.66	\$ 9,399,335.66	\$ -	Aulas Laboratorio Cubículos Centro de cómputo Oficinas Área común TOTAL	2 3 1 1 5 13	491.24 440.54 205.40 132.23 28.46 317.42 1,615.37	Otra concluida		100	29/05/20	3/01/21		Si	Rectora Dra. Sara D. León de Guzmán González, 16Jun/21	Si	Si	9,399,335.66		
9	Trabajos complementarios para poner en operación el edificio del Centro de Investigaciones Biomédicas, región Xalapa (complemento de recursos 2)	X				\$ 56,138.56	\$ 56,138.56	\$ -	Trabajos complementarios	1	693.00	Otra concluida		100	21/12/20	30/12/20		Si	Rectora Dra. Sara D. León de Guzmán González, 28/10/20	Si	Si	56,138.56		
10	Construcción de edificio para la Facultad de Matemáticas, de Física y el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial (Medio tallerón), región Xalapa complemento de recursos 2					\$ 135,207.43	\$ -	\$ 135,207.43	Otra media tallerón	1	330.00	Otra en proceso		1	17/09/21	31/10/21								
						\$20,783,893.77	\$20,448,345.34	\$135,207.43																

El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFPLAN) refirió a la Universidad Veracruzana la asignación de recursos del FAM 2019 remanente 1a. ministración resultante de of. no. SFP/087/32019 de fecha 10Jun/2019 por \$3,788,629.93. La 2a. ministración mediante of. no. SFP/1881/2019 de fecha 06/07/20 por \$3,787,504.52. La 3a. ministración mediante of. no. SFP/2202/2019 de fecha 19/06/2019 por \$3,788,121.71. La 4a. ministración mediante of. no. SFP/2009/2019 de fecha 20/06/2019 por \$9,399,337.01. Los recursos en su totalidad ya fueron radicados a la Universidad Veracruzana.

Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez

Nombre y firma del Titular de la IES

M. Anq. Emilia P. Rodiles Justo

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se captarán los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anular líneas como sea necesario.  
2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismas que se verán reflejados en el reporte fotográfico.  
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: día, mes y año.

2019

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado:  
septiembre\_2021

FECHA DE CORTE: 30/09/2021

ANFO

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (REMANENTES)

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Universidad Veracruzana

Indicador de avance

Porcentaje de avance

100%

PRIORIDAD 1

Nombre de la obra: 2a. etapa de rehabilitación del Centro de Estudios y Servicios en Salud, región Veracruz

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO



ITURBIDE ESG. CARMEN BENDAN, COL. FLORES MAGÓN, VER.

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: Pasillo interior

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra concluida



F3: Escaleras



F4: Pasillo



F5: Techos

Dr. Martín Gerardo Aguilar Sarantes

Nombre y firma del Titular de la IES

M. Ana Estepa R. Rodríguez

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que en anexa reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestana, se podrán copiar tantas pestanas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adscripciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



2019

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (REMANENTES)

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado: **septiembre\_2021**

FECHA DE OORTE: 30/09/2021

REPORTÉ FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Universidad Veracruzana

Porcentaje de avance

100%

PROYECTO 2 Nombre de la obra **Trabajos complementarios de obra eléctrica y aire acondicionado en el CESS, región Veracruz**

ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN

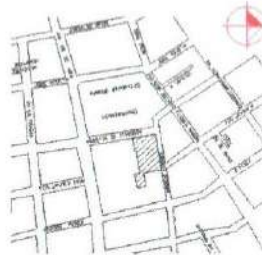

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



ITURBIDE ESO, CARMEN SERDÁN, DOL FLORES MAGÓN, VER.

FOTOS



F1: Subestación eléctrica



F2: Climas en azotea

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra concluida



F3: Pasillo



F4: Habitación eléctrica



F5: Pasillo

Dr. Martín Gálvez Aguirre Sánchez

Nombre y firma del Titular de la IES

M. Aída Enríquez P.

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporté fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestañita, se podrán copiar tantas pestañitas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.





Universidad Veracruzana

CANTIDAD REALIZADA  
Porcentaje de avance



100%

3

Nombre de la obra:

Construcción de espacios educativos en el edificio "B" de las Facultades de Matemáticas y de Física, región Xalapa

## CRUCIOS DE LOCALIZACIÓN

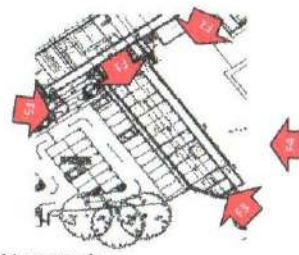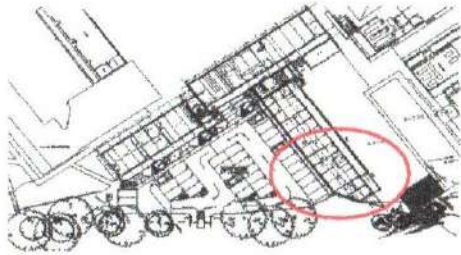

Referencia de fotos en croquis

## UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CIRCUITO GONZALO AGUIRRE BELTRÁN S/N. ZONA UNIVERSITARIA, XALAPA, VIER.



F1: Vista del acceso



F2: Vista lateral

## Comentarios de los trabajos realizados:

Obra concluida



F3: Vista del pasillo



F4: Vista interior



F5: Vista interior

Dr. MASH Gerardo Aguilar Sánchez

Nombre y firma del Titular de la IES

M. No. Enríque P. Robles Juárez

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de las IES



## REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



PROYECTO

4

Nombre de la obra:

Conclusión de 2 aulas en la Facultad de Matemática, región Xalapa

## CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

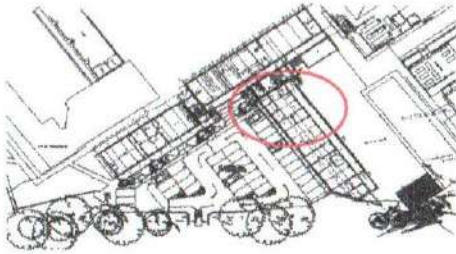

Referencia de fotos en croquis

## UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CIRCUITO GONZALO AGUIRRE BELTRÁN SN. ZONA  
UNIVERSITARIA, XALAPA, VER.

Universidad Veracruzana

UNIVERSIDAD VERACRUZANA

Porcentaje de avance

100%

## FOTOS



F1: vista del acceso



F2: vista lateral



F3: visto general



F4: Vista interior



F5: Vista exterior

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra concluida

Dr. Iván Gerardo Aguilar Sánchez

Nombre y firma del Titular de la IESB

M. Ana Ester Rodríguez Alva

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IESB



2019

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (REMAMENTER)

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado:  
septiembre\_2021

FECHA DE CORTE: 30/09/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL





Universidad Veracruzana

Porcentaje de avance

100%

PROGRAMA 5 Nombre de la obra: **Construcción de subestación eléctrica en las Facultades de Matemáticas y de Física, región Xalapa**

GRUPOS DE LOCALIZACIÓN

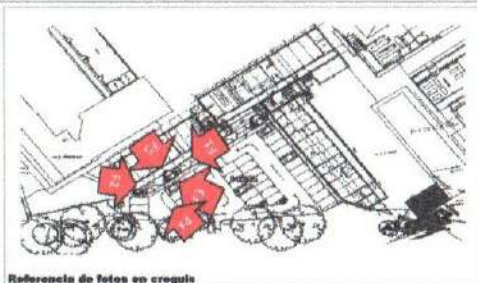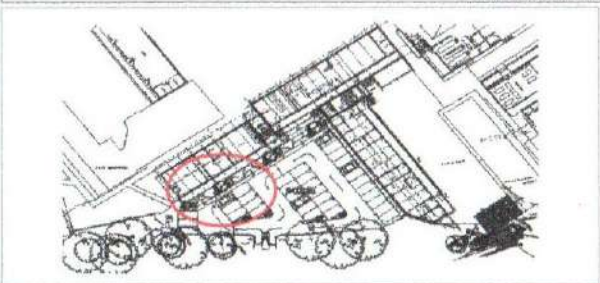

Referencia de fotos en croquis

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO



CIRCUITO GONZALO AGUIRRE BELTRAN S/N. ZONA UNIVERSITARIA, XALAPA, VER.

FOTOS



F1: Fachada lateral



F7: posterior

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra concluida



F2: Fachada lateral



F4: Fachada lateral

D<sup>a</sup> Myriam Gerardo Aguilar Sánchez  
Nombre y firma del Titular de la IES

M. Ana Emilia P. Rubio Jasso  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



2019

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (REMANENTES)

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
septiembre\_2021

FECHA DE CORTE: 30/09/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Universidad Veracruzana

Porcentaje de avance



100%

PROYECTO

Nombre de la obra:


Construcción de cafetería y 2a. Etapa de estacionamiento en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura, región Poza Rica-Tuxpan

ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN

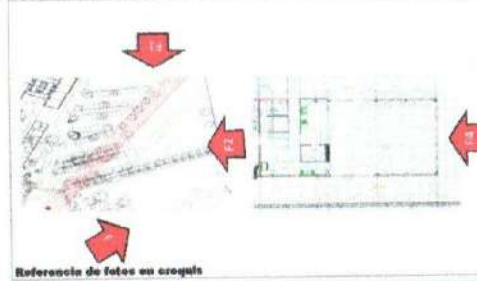

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CARRETERA POZA RICA PAPANTLA, COL. HALLIBURTON ANTES GUADALUPE VICTORIA, POZA RICA, VER.

FOTOS



P1: Vista del Edificio A



P2: Vista de frente

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra concluida



P3: Vista de frente



P4: Vista de la cafetería exterior



P5: Vista del estacionamiento

Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez

Nombre y firma del Titular de la IES

M. An... ..

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una planifia, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y luz para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAMMUTRES)

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
septiembre 2021  
FECHA DE CORTE: 30/09/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Universidad Veracruzana



Porcentaje de avance

100%

7 Nombre de la obra:

Continuación de la construcción del edificio para la Facultad de Matemáticas, de Física y el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial, región Xalapa.  
Complemento de recursos

ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN

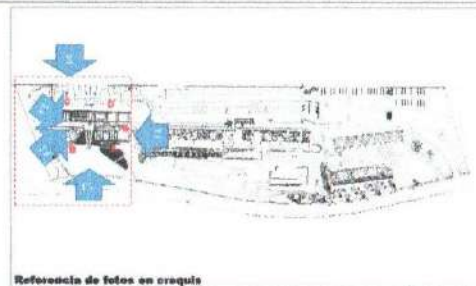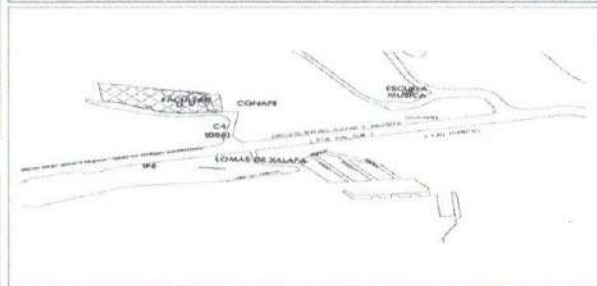

Refrescada de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CALLE PADEO No. 112, LOTE II SECC 2A, LETRA B, COL. DESARROLLO HABITACIONAL NUEVA XALAPA, XALAPA, VER.

FOTOS



F1: Edificio (E) Rampas entre edificio A y D



F2: Estructura escaleras

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra concluida



F3: Dimensionación Canto del elevador



F4: Fachada posterior (dubo del elevador)



F5: Fachada principal cubo de escaleras (nuevo)

Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez

Nombre y firma del Titular de la IES

M. Arq. María P. Rodríguez Acuña

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de Infraestructura

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



2019

# FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAMMETS)

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado:  
**septiembre\_2021**  
FECHA DE CORTE: 30/SEP/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL





Universidad Veracruzana

Porcentaje de avance

# 100%

Nombre de la obra: **Continuación de la construcción del edificio para la Facultad de Matemáticas, de Física y el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial, región Xalapa. Complemento de recursos 2.**

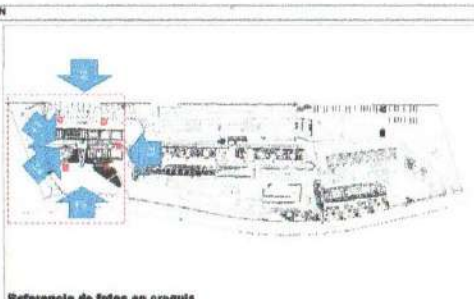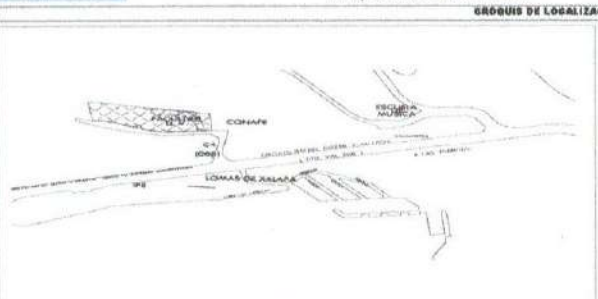

Referencia de fotos en croquis



CALLE PASEO No. 113, LOTE B, SECC. 3A, LETRA B, COL. DESARROLLO HABITACIONAL, NUEVA XALAPA, XALAPA, VER.

### FOTOS



F1: Edificio (E) Rampa entre edificio A y D



F2: Estructura escaleras

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra concluida



F3: Cimentación Cubo del elevador



F4: Fachada posterior (cubo del elevador)



F5: Fachada principal cubo de escaleras y rampa

Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez  
Nombre y firma del Titular de la IES

M. Ang. Evelyn P. Robles Salas  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestañita, se podrán copiar tantas pestañitas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



2019

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAMMINTS)

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
septiembre\_2021  
ESCALA DE COORTE 30x40/10000

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Universidad Veracruzana

Porcentaje de avance

100%

Nombre de la obra: Trabajos complementarios para poner en operación el edificio del Centro de Investigaciones Biomédicas, región Xalapa (complemento de recursos 2)

ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN

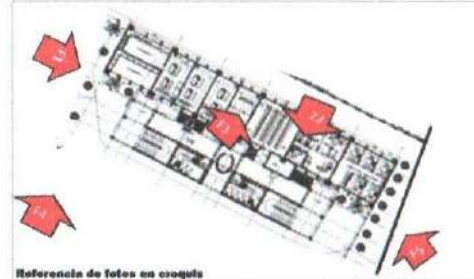

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CIRCUITO VERACRUZ No 5 COL. INDUSTRIAL, XALAPA, VER.

FOTOS



P1:



P2:

Comentarios de los trabajos realizados:

Obras concluida



P3:



P4:



P5:

Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez

Nombre y firma del Titular de la ES

M. Inq. Estela P. Robles

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de Infraestructura

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, ma/mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Nombre del responsable



Porcentaje de avance

# 1%

PRINCIPAL 10 Nombre de la obra:

### Construcción de edificio para la Facultad de Matemáticas, de Física y el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial (Media tensión), región Xalapa complemento de recursos 2

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

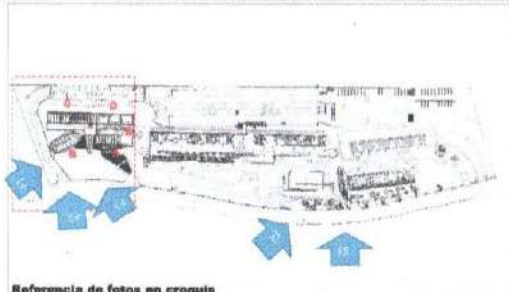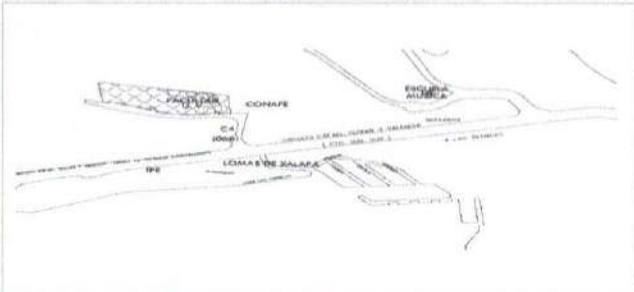

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CALLE PASEO No. 112, LOTE II SECC. 2A, LETRA B, COL. DESARROLLO HABITACIONAL NUEVA XALAPA, XALAPA, VER.

FOTOS



F1: Edificio (B) Entrada principal



F2: Vista Exterior Facultad

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra en proceso



F3: Edificio (B) Transformadores



F4: Estacionamiento area de medición



F5: Estacionamiento Area de medición

Dr. Martín Cleverdo Aguilar Sánchez  
Nombre y firma del Titular de la IES

M. Arq. Ennio P. Rodas Arco  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.
