

2021

AÑO

FAM
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL, DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

 Mes reportado
diciembre_2021
 FECHA DE CORTE: 31/01/2021

REPORTES DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL
DATOS DE LA UNIVERSIDAD


Universidad Veracruzana

fecha de la universidad

 Nombre: **Universidad Veracruzana**

Entidad Federativa: Veracruz

Clave Inst 911: 30MIL020408

Planeación

 Nombre: **Mrs. Norma Angélica Leganes López**
 Cargo: **Ejecutiva de la Dirección de Planeación Institucional**
 Teléfono: **(229) 9421705 EXT. 12718**
 Correo electrónico: **nlleganes@uv.mx**

Obras y Mantenimiento

 Nombre: **M. Anq. Emilia P. Rodiles Justo**
 Cargo: **Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento**
 Teléfono: **(229) 9421700 EXT. 12702**
 Correo electrónico: **erodiles@uv.mx**
DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO
OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Reservado	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas				
		Obras de infraestructura	Equipamiento	Adquisición de bienes	Mantenimiento	Proyectos institucionales				Espacios físicos	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Termino			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega- Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción	Monto de Acta Administrativa		
																									GLOBAL DEL PROYECTO	GLOBAL DEL PROYECTO
1	Construcción 1er. Nivel del edificio "D" en la Facultad de Ciencias Químicas, región Coahuacalco- Minatitlán.	X					\$ 9,000,000.00	\$ 4,969,500.42	\$ 4,433,399.89	Pilas	2	374.00	Obras en proceso	Tramitar estimaciones	95	18/08/21	04/01/22	La asignación de recursos del FAM 2021 fue informada por la DGESEU mediante el Nlan. 511/2021-G04-83 con fecha 16/08/21. A la fecha, la SEFPLAN ha realizado la totalidad de los recursos a la LUV de acuerdo al calendario de ministraciones mensuales.								
2	Construcción 3a etapa de módulo de aulas en la Facultad de Arquitectura, región Poza Rica-Tuxpan.	X					\$ 15,000,000.00	\$ 9,310,896.95	\$ 8,684,103.02	Pilas	2	299.00	Obras en proceso	Tramitar estimaciones	45	14/06/21	02/03/22	La asignación de recursos del FAM 2021 fue informada por la DGESEU mediante el Nlan. 511/2021-G04-83 con fecha 16/08/21. A la fecha, la SEFPLAN ha realizado la totalidad de los recursos a la LUV de acuerdo al calendario de ministraciones mensuales.								
3	Construcción 1er. Nivel en el edificio del Centro de Investigaciones Biomédicas, región Xalapa.	X					\$ 7,382,100.00	\$ 2,178,266.82	\$ 6,192,844.04	Pilas	2	374.00	Obras en proceso	Tramitar estimaciones	50	22/08/21	08/02/22	La asignación de recursos del FAM 2021 fue informada por la DGESEU mediante el Nlan. 511/2021-G04-83 con fecha 16/08/21. A la fecha, la SEFPLAN ha realizado la totalidad de los recursos a la LUV de acuerdo al calendario de ministraciones mensuales.								
							\$31,282,100.00	\$18,091,704.62	\$15,220,398.94	TOTAL																

Dr. Martín Gerardo Aguilar-Sánchez

Nombre y firma del Titular de la IES

M. Anq. Emilia P. Rodiles Justo

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se capturan los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán omitir tanto filas como sea necesario.
 2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
 3 Es importante que las fechas del inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: 04, 09 y 10.

2021

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
diciembre_2021

FECHA DE CORTE: 31/12/2021

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Universidad Veracruzana



Porcentaje de avance

95%

PRORIDAD: 4

Nombre de la obra: **Construcción 1er. Nivel del edificio "O" en la Facultad de Ciencias Químicas, región Coatzacoalcos-Minatitlán.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

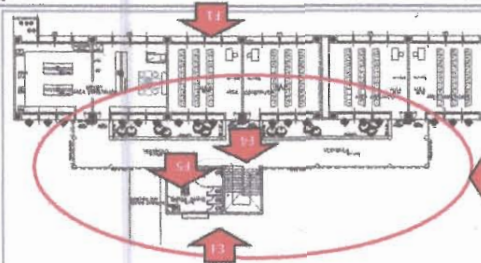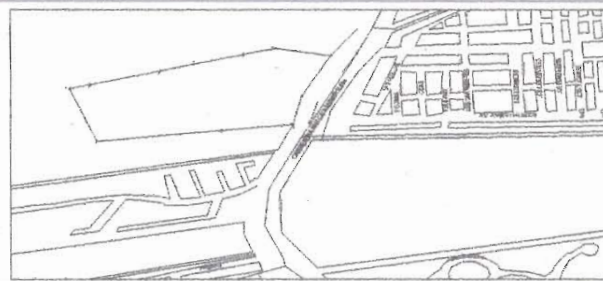

Referencia de fotos en croquis

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO



AV. UNIVERSIDAD S/N (CARRETERA A MINATITLÁN KM. 7.8)
COATZACOALCOS VER.

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: Lateral



F3: Fachada posterior



F4: Entrada

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra en proceso



F5: Interior

Dr. Martín Gerardo Aguilera Sánchez

Nombre y firma del Titular de la IES

M. Arq. Emma P. Rojas Jasso

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2021

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA -
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
diciembre_2021
FECHA DE CURTE: 31/03/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance

45%


PRIORIDAD

2

Nombre de la obra:

Construcción 3a etapa de módulo de aulas en la Facultad de Arquitectura, región Poza Rica-Tuxpan.

CRÓQUIS DE LOCALIZACIÓN

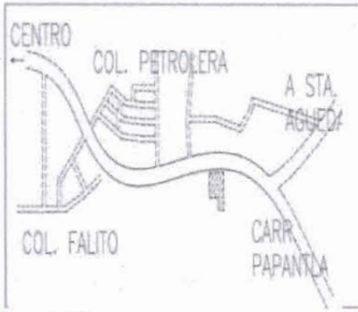

CARRETERA POZA RICA PAPANTLA, COL. HALLIBURTON ANTES GUADALUPE VICTORIA, POZA RICA, VER.

Referencia de fotos en croquis

FOTOS



F1: Fachada norte (segundo nivel)



F2: Fachada este (segundo nivel)

Comentarios de los trabajos realizados:
Obra en proceso



F3: Fachada Sur (segundo nivel)



F4: Fachada Oeste (segundo nivel)



F5: Interior (segundo nivel)

Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez
Nombre y firma del Titular de la IES

M. Arq. Emile P. Rodiles Justy
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2021

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado:
diciembre_2021

FECHA DE CORTE: 31/12/2021

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance

50%


PRIORIDAD

3

Nombre de la obra:

Construcción 1er. Nivel en el edificio del Centro de Investigaciones Biomédicas, región Xalapa.

CROQUIS DE LOCALIZACION

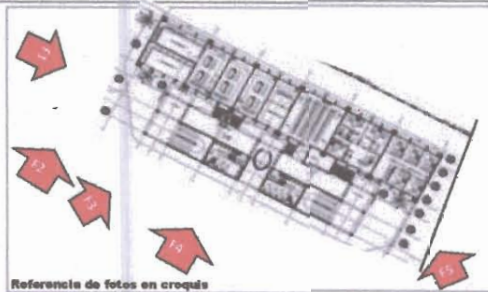

Referencia de fotos en croquis

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO



CIRCUITO VERACRUZ No 5 COL. INDUSTRIAL ANIMAS, XALAPA, VER.

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: Fachada lateral izquierda

Comentarios de los trabajos realizados:
Obra en proceso



F3: vista general de edificio



F4: fachada lateral izquierda



F5: Fachada lateral

Dr. Martín Sánchez Aguilar-Gil Sánchez
Nombre y firma del Titular de la IES

M. Arc. Emilio P. Rodríguez
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capturen a misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
