

2019

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES REMANENTES RENDIMIENTOS FINANCIEROS

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
diciembre\_2021

FECHA DE CORTE: 31/01/2021

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad Veracruzana

Entidad federativa: Veracruz

Clave Inst 911: 30MSL09408

RESPONSABLES

Nombre: Mtra. Norma Angelina Lagunes López  
Cargo: Encargada de la Dirección de Planeación Institucional  
Teléfono: (239) 8421700 EXT. 12719  
Correo electrónico: nlagunes@uv.mx

Nombre: M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo  
Cargo: Directora de Proyect. Construcción y Mantenimiento  
Teléfono: (239) 8421700 EXT. 12702  
Correo electrónico: erodiles@uv.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>			Acciones que sustentan el avance <sup>2</sup>	Acciones por realizar	% de avance	Fechas <sup>3</sup>		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada				
		Obra de conservación	Reparación	Modernización y mejoras	Reconstrucción				Programa prioritario	Especificación	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega- Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción
1	Conectividad de voz y datos en el área de expedientes y archivo del 2° nivel edificio D, Unidad Central, región Xalapa, complemento de recursos	X				\$ 62,786.37	\$ 62,786.00	\$ 0.37	Instalación de voz y datos	1	137.56	Obra concluida		100	11/11/19	25/11/19		No			SI	SI	62,786.00
2	Rehabilitación de las escaleras de acceso principal a la Unidad Central, región Xalapa, complemento de recursos 2	X				\$ 16,100.43	\$ 15,804.54	\$ 340.89	Barandal en escaleras	1	6.00	Obra concluida		100	23/12/19	5/02/20		No			SI	SI	15,804.54
3	Construcción de cubierta para la planta de tratamiento de aguas residuales en la Dirección General de Investigaciones, región Xalapa, complemento de recursos	X				\$ 12,402.53	\$ 12,377.29	\$ 25.24	Cubierta planta de tratamiento	1	63	Obra concluida		100	20/12/18	17/02/20	El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) notificó a la Universidad Veracruzana la asignación de recursos del FAM 2019 Remanente rendimientos financieros la ministración mediante of. no. SFP/0673/2019 de fecha 10Jun2019 por \$ 62,786.37. La 2a. ministración fue notificada mediante of. no. SFP/1186/2019 de fecha 21Ago2019 por \$16,300.43. La 3a. ministración fue notificada mediante of. no. SFP/1547/2019 de fecha 22Ago2019 por \$12,402.53. La 4a. ministración fue notificada mediante of. no. SFP/1881/2019 de fecha 04Oct2019 por \$6,225.25. La 5a. ministración fue notificada mediante of. no. SFP/1918/2019 de fecha 11Mar2019 por \$6,548.24. La 6a. ministración fue notificada mediante of. no. SFP/2150/2021 de fecha 15Ago2021 por \$37,941.16. Los recursos en su totalidad ya fueron radicados a la Universidad Veracruzana.	No			SI	SI	12,377.29
4	Construcción de cafetería y 2a. Etapa de estacionamiento en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura, región Poza Rica-Tuxpan, complemento de recursos	X				\$ 6,225.25	\$ 6,225.25	\$ 0	Cafetería	1	275	Obra concluida		100	20/10/20	17/01/21		No			SI	SI	6,225.25
5	Construcción de cafetería y 2a. Etapa de estacionamiento en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura, región Poza Rica-Tuxpan, complemento de recursos 2	X				\$ 6,548.24	\$ 6,548.24	\$ 0	Cafetería	1	275	Obra concluida		100	20/10/20	17/01/21		No			SI	SI	6,548.24
6	Construcción de cubículos en planta alta de edificio "R" (CIDEA) del Centro de Institutos, región Xalapa.	X				\$ 37,941.16	\$ 0	\$ 37,941.16	Cubículos	11	140 m2	Obra en proceso		5	15/12/21	28/01/22							
						\$142,695.98	\$163,743.32	\$36,012.86															

Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez

Nombre y firma del Titular de la IES

M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se capturan los aspectos que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tantas filas como sea necesario.  
2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.  
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mes y aa.

2019

ARC

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES REMANENTES RENDIMIENTOS FINANCIEROS

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**diciembre\_2021**  
FECHA DEL CORTE: 31/DIC/2021

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance



100%

PROYECTO

1

Nombre de la obra: **Conectividad de voz y datos en el área de expedientes y archivo del 2° nivel edificio D, Unidad Central, región Xalapa, complemento de recursos**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

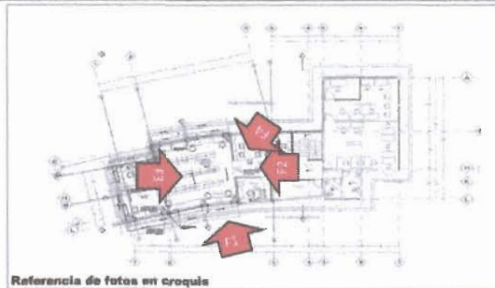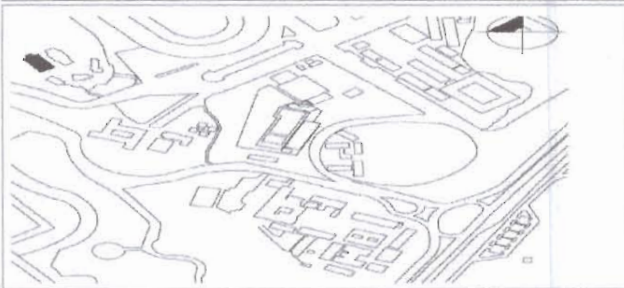

Referencia de fotos en croquis

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO



CIRCUITO GONZALO AGUIRRE BELTRAN EN LOMAS DEL ESTADIO, ZONA UNIVERSITARIA, XALAPA, VER.

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: Vista interior



F3: Vista interior



F4: Vista interior

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra concluida

Dr. Merhi Gerardo Aguilar Sánchez

Nombre y firma del Titular de la IES

M. Anz. Emilia P. Flores Acuña

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaina, se podrán copiar tantas pestainas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**diciembre\_2021**  
FECHA DE CORTE: 31/DIC/2021

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES REMANENTES RENDIMIENTOS FINANCIEROS

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Universidad Veracruzana


Porcentaje de avance

100%

PROYECTO 2

Nombre de la obra: **Rehabilitación de las escaleras de acceso principal a la Unidad Central, región Xalapa, complemento de recursos 2**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

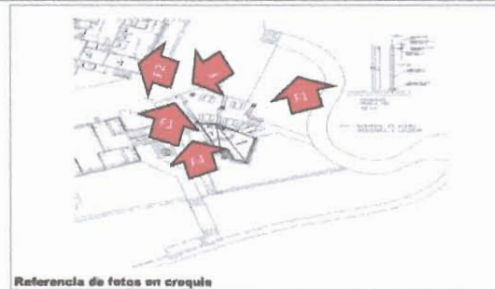

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CIRCUITO GONZALO AGUIRRE BELTRAN EN LOMAS DEL ESTADIO, ZONA UNIVERSITARIA, XALAPA, VER.

FOTOS



F1: Escalera 1



F2: Escalera 2

Comentarios de los trabajos realizados:  
  
Obra concluida



F3: Escalera 3



F4: Escalera 4



F5: Escalera 5

Dr. Martín Orlando Aguilar Sánchez  
Nombre y firma del Titular de la IES

M. Arc. Enilda P. Torres Zúñiga  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestana, se podrán copiar tantas pestanas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
diciembre\_2021

AÑO

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES NEMANENTES RENDIMIENTOS FINANCIEROS

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

FECHA DE CORTE: 31/02/2021



Universidad Veracruzana

Logo de la institución

Porcentaje de avance

100%


(PROYECTO)

3

Nombre de la obra:

Construcción de cubierta para la planta de tratamiento de aguas residuales en la Dirección General de Investigaciones, región Xalapa, complemento de recursos

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



AV. LUIS CASTELAZO AYALA No. 11 COL. INDUSTRIAL ANIMAS, XALAPA, VER. Y CIRCUITO VERACRUZ No. 3 COL. INDUSTRIAL LINDA VISTA-LAS ANIMAS, XALAPA, VER.

FOTOS



F1: Vista frontal de la planta de tratamiento



F2: Vista posterior de la planta de tratamiento



F3: Estructura 3

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra concluida

Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez

Nombre y firma del Titular de la IES

M. Ana; Emilia P. Rodríguez Justo

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una planilla, se podrán copiar tantas planillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL-DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**diciembre\_2021**  
FECHA DE CORTE: 31/12/2021

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES REMANENTES RENDIMIENTOS FINANCIEROS


REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance

**100%**

PROCESO 4 Nombre de la obra: **Construcción de cafetería y 2a. Etapa de estacionamiento en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura, región Poza Rica-Tuxpan, complemento de recursos**

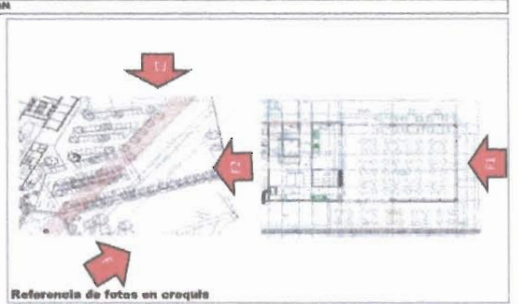

FOTOS



F1: Vista del estacionamiento



F2: Vista del estacionamiento



F3: Vista del estacionamiento



F4: Vista de la cafetería actual

Comentarios de los trabajos realizados:  
  
Obra concluida

Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez  
Nombre y firma del Titular de la IES

M. Araceli Estrella Rodríguez  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una planilla, se podrán copiar tantas planillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**diciembre\_2021**  
FECHA DE CORTE: 31/12/2021

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES REMANENTES RENDIMIENTOS FINANCIEROS

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance



100%

PROYECTO

5


Nombre de la obra: **Construcción de cafetería y 2a. Etapa de estacionamiento en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura, región Poza Rica-Tuxpan, complemento de recursos 2**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

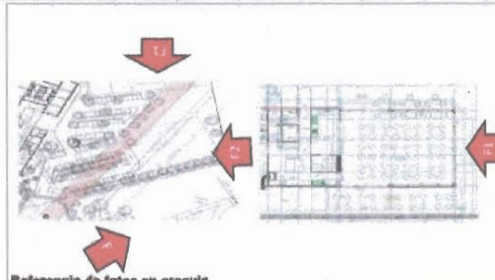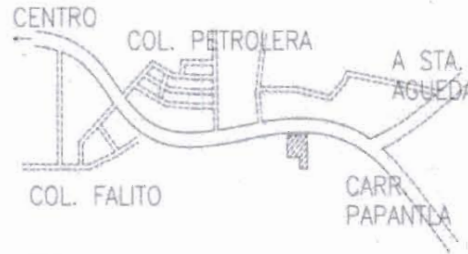

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CARRETERA POZA RICA PAPANTLA, COL. HALLIBURTON ANTES GUADALUPE VICTORIA, POZA RICA, VER.

FOTOS



F1: Vista del estacionamiento



F2: Vista del estacionamiento



F3: Vista del estacionamiento



F4: Vista de la cafetería actual

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra concluida

Dr. Matih Gerardo Aguilar Saavedra

Nombre y firma del Titular de la IES

M. An. Rodolfo A. Rodríguez

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pastafila, se podrán copiar tantas pastafilas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**diciembre\_2021**  
FECHA DE CORTE: 31/DIC/2021

AÑO

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES REMANENTES RENDIMIENTOS FINANCIEROS

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Universidad Veracruzana

Porcentaje de avance:


5%

PRIMORDIAL

e

Nombre de la obra: **Construcción de cubículos en planta alta de edificio "R" (CIDEA) del Centro de Institutos, región Xalapa.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

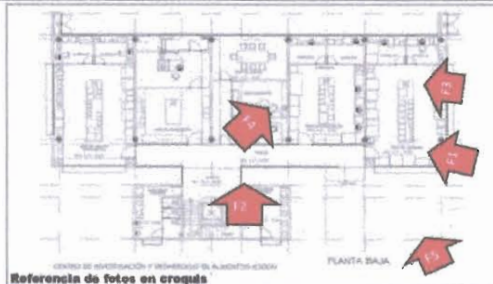

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CIRCUITO VERACRUZ No 6 COL. INDUSTRIAL ANIMAS, XALAPA, VER.

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: Primer Nivel laboratorios

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra en proceso



F3: vista general primer nivel



F4: Vista general primer nivel



F5: Primer nivel

Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez

Nombre y firma del Titular de la IES

M. Arq. Emilia P. Rodas-Justo

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
