

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: **Universidad Veracruzana**
Entidad Federativa: **Veracruz**
Código del IES: **3010100400**

Planesación
Nombre: **Mtra Norma Angélica Laguna López**
Cargo: **Directora de la Dirección de Planificación Institucional**
Teléfono: **(228) 8421700 EXT: 12719**
Correo electrónico: **maguina@uv.mx**

Obras y Mantenimiento
Nombre: **M. Arq. Emilia P. Rojas Justo**
Cargo: **Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento**
Teléfono: **(228) 8421700 EXT: 12702**
Correo electrónico: **erajas@uv.mx**

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Avance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fecha ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
		Obras de infraestructura	Equipamiento	Adquisición de bienes y mobiliario	Mantenimiento	Proyectos académicos				Espacios físicos	Cantidad	metros cuadrados				Inicio	Termino			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega- Recepción (Acta final)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción	Monto de Acta Administrativa
GLOBAL DEL PROYECTO																								
1	Comisión de espacio para aula de la LENA, campus Cotacacostoc	X					\$ 344,268.39	\$ 344,236.39	\$ -	Actas	1	103	Obra concluida		100	22/11/21	11/12/21		SI		SI	SI	\$344,236.39	
2	Laboratorio de Innovación tecnológica Comercio Microsoft-UV-Gob. Federal en la USBI, región Xalapa		X				\$ 1,130,800.00	\$ 1,128,860.30	\$ 334.70	Laboratorio	1	143	Obra concluida		100	06/10/20	03/11/20		NO		SI	SI	\$1,129,860.30	
3	Continuación del mantenimiento del Foro Abierto "Miguel Vélez" del Centro Cultural Casa del Lago, región Xalapa			X			\$ 250,000.00	\$ 238,652.28	\$ 14,347.72	Foro abierto	1	370	Obra concluida		100	13/11/20	12/12/20		NO		SI	SI	\$238,652.28	
4	Cubierta del patio central de la Dirección General de Difusión Cultural, región Xalapa		X				\$ 1,300,800.00	\$ 1,280,051.35	\$ 19,748.65	Patio	1	307	Obra concluida		100	26/04/21	09/07/21		SI	SI	Factura Dra. Sara D. León de Guerra González, 16jun/21	SI	SI	\$1,280,051.35
5	Referzamiento de estructura metálica por sismo del edificio "B" en las Facultades de Matemáticas, Física y el Centro de Investigaciones en Inteligencia Artificial, campus Sur, región Xalapa	X					\$ 1,400,800.00	\$ 1,398,990.92	\$ 1,809.08	Oficina	1	1209	Obra concluida		100	28/01/21	28/02/21		SI	SI	Factura Dra. Sara D. León de Guerra González, 16jun/21	SI	SI	\$1,399,990.92
6	Adaptación de espacios en la USBI Nocame para aulas de capacitación China-Veracruz, región Veracruz		X				\$ 380,000.00	\$ 283,028.24	\$ 96,971.76	Actas Cubículo Patio	3 1 1	117 9 16	Obra concluida		100	18/11/20	17/12/20		NO		SI	SI	\$283,028.24	
7	Adopaso en estacionamiento y cubierta de acceso en las Facultades de Matemáticas, Física y el Centro de Investigaciones en Inteligencia Artificial, campus Sur, región Xalapa	X					\$ 2,370,800.00	\$ 2,272,529.68	\$ 97,470.32	Obra exterior	1	1080	Obra concluida		100	29/12/20	26/02/21		SI	SI	Factura Dra. Sara D. León de Guerra González, 16jun/21	SI	SI	\$2,272,529.68
8	Adaptación de espacio para el SAIBUV en Orizaba	X					\$ 700,000.00	\$ 698,674.12	\$ 1,325.88	Módulo de servi/Módulo	1	96	Obra concluida		100	07/06/21	16/07/21		SI	SI	Factura Dra. Sara D. León de Guerra González, 11jun/21	SI	SI	\$698,674.12
9	Adaptación de espacio para el SAIBUV en Piza Rica	X					\$ 700,000.00	\$ 698,240.47	\$ 1,759.53	Módulo de servi/Módulo	1	101	Obra concluida		100	17/06/21	15/06/21		SI	SI	Factura Dra. Sara D. León de Guerra González, 08jun/21	SI	SI	\$698,240.47
10	Adaptación de espacio para el SAIBUV en Cotacacostoc	X					\$ 400,000.00	\$ 384,669.83	\$ 15,330.17	Módulo de servi/Módulo	1	78	Obra concluida		100	19/07/21	17/08/21		SI	SI	Factura Dra. Sara D. León de Guerra González, 16jun/21	SI	SI	\$384,669.83
11	Adaptación de espacio de Artes en el CUACC, región Orizaba-Córdoba	X					\$ 629,783.07	\$ 629,722.00	\$ 61.07	Taller de Artes	1	399	Obra concluida		100	18/06/21	27/07/21		NO	NO	SI	SI	\$629,722.00	
12	Substitución del edificio "A" 2a etapa (obra complementaria) en la Facultad de Ing. Mecánica y Ciencias Navales, región Veracruz	X					\$ 2,250,800.00	\$ 2,054,101.61	\$ 196,698.39	Área administrativa Aulas Cubículos	1 19 74	403 1382 692	Obra concluida	Transferir finiquito	100	09/06/21	27/08/21							
										TOTAL		2847												
13	Substitución de edificio "B" 2a etapa (obra complementaria) en la Facultad de Ingeniería Mecánica, para la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, región Veracruz	X					\$ 1,725,915.74	\$ 1,000,629.33	\$ 725,286.41	Salones Cientos de cómputo	2 9	26 795	Obra en proceso	Transferir finiquito	83	07/08/21	24/01/22		SI	SI	Factura Dra. Sara D. León de Guerra González, 16jun/21			
										TOTAL		1384												
14	Trabajos complementarios en el edificio para las facultades de Matemáticas, Física y el Centro de Investigaciones en Inteligencia Artificial, campus Sur, región Xalapa.	X					\$ 3,892,187.60	\$ 3,877,830.10	\$ 14,357.50	Voz y datos Habitación laboratorio Baños	1 1 1	1 5088.90 1	Obra concluida		100	07/08/21	10/07/21		SI	SI	Factura Dra. Sara D. León de Guerra González, 16jun/21	SI	SI	\$3,877,830.10
										TOTAL		6887												
							\$17,871,822.88	\$16,299,228.82	\$1,572,594.06															

* Nota: En el reporte del Ser. Tercerías se informó la obra no. 23 con un avance del 100% que corresponde a un contrato finalizado. Sin embargo, posterior a esa fecha, se elaboró un nuevo contrato con los mismos datos, informándose en el presente informe un avance de la obra del 85%.

Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez
Nombre y firma del Titular de la IES

M. Arq. Emilia P. Rojas Justo
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se cambian los espacios que caracterizan a la obra concluida. Se podrán anexar tanto fotos como sea necesario.
2 En esta sección se redacta de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se van actualizando en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en día, mes, año y hora.

2020

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PERMANENTE)

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
diciembre 2021

FECHA DE CORTE: 31/12/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Universidad Veracruzana

Porcentaje de avance

100%



PRORIDAD

1

Nombre de la obra:

Conclusión de espacio para aula de la LENA, campus Coatzacoalcos

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

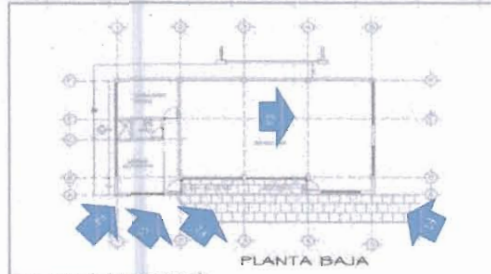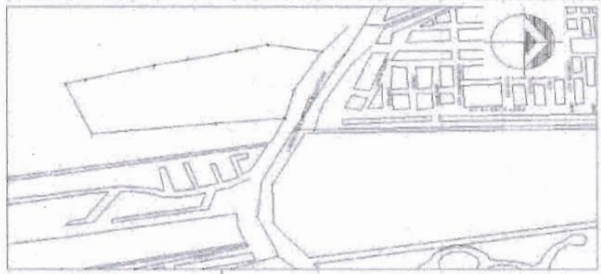

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



AV. UNIVERSIDAD SN (CARRETERA A MINATITLÁN KM. 7.8)
COATZACOALCOS VER.

FOTOS



F1: Vista exterior lateral



F2: Fachada principal

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra concluida



F3: Vista interior



F4: Vista lateral exterior



F5: Fachada principal

Dr. Martín Gerardo Aguilar Semmes

Nombre y firma del Titular de la IES

M. Arq. Enlla P. Rodríguez Jasso

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una plantilla, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (REMANENTE)

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
diciembre_2021
FECHA DE CORTE: 31/12/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Universidad Veracruzana

Porcentaje de avance

100%

Nombre de la obra: **Laboratorio de Innovación tecnológica Convenio Microsoft- UV-Gob. Federal en la USBI, región Xalapa**

CRUCIOS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



AVENIDA DE LAS CULTURAS VERACRUZANAS NO. 1 COL. MÁRTIRES DE CHICAGO, XALAPA, VER.

FOTOS



F1: Vista Interior 1



F2: Vista Interior 2

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra concluida



F3: Vista Interior 3



F4: Vista del acceso



F5: Vista Interior 5

Dr. Martín Guzmán Aguilar Sánchez
Nombre y firma del Titular de la JES

M. Ayo Emilia P. Rodríguez
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la JES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestanía, se podrán copiar tantas pestanías como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (REMANENTE)

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
diciembre_2021
FECHA DE OBTENCIÓN: 31/01/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Universidad Veracruzana

Porcentaje de avance

100%




CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

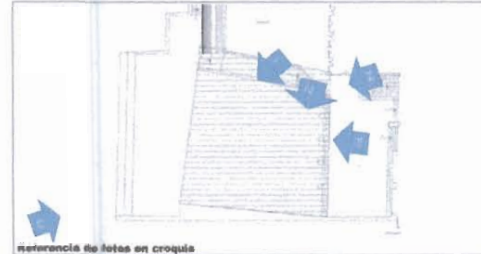

referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



DELEGADO GÓMEZ GARCÍA, No. 24 COL. CENTRO, XALAPA, VER.

FOTOS



F1: Vista de la superficie del foro abierto



F2: Estado actual de la estructura

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra concluida



F3: Estado actual intersección de cubiertas



F4: Estado actual cubierta foro abierto



F5: Vista del foro desde el paseo de la zona

Dr. Martín Gerardo Aguirre Sánchez

Nombre y firma del Titular de la IES

M. Ang. Ericka P. Rodríguez

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestana, se podrá copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones. en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

RFID

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (REMANENTE)

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL, DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

diciembre_2021

FECHA DE CORTE: 31/12/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Universidad Veracruzana

Porcentaje de avance

100%

ESPECIALIDAD 4 Nombre de la obra: **Cubierta del patio central de la Dirección General de Difusión Cultural, región Xalapa**

ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN

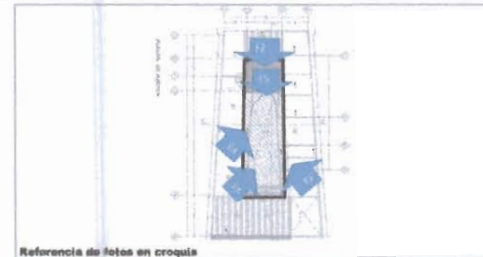

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



JARDINES DEL COL. CENTRO, XALAPA, VER.

FOTOS



P1: Vista desde azotea 1



P2: Vista desde planta alta 1

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra concluida



P3: Vista desde planta alta 2



P4: Vista desde azotea 2



P5: Vista general de la obra

Dr. Martín Guzmán Aguilar Salazar
Nombre y firma del Titular de la IES

M. Aty Eneida P. Rodríguez López
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestana, no podrán copiar tantas pestanas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma foto, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PERMANENTES)

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
diciembre_2021

FECHA DE CORTE: 31/12/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Universidad Veracruzana

Porcentaje de avance

100%



PROYECTO

5

Nombre de la obra:

Reforzamiento de estructura metálica por sismo del edificio "B" en las Facultades de Matemáticas, Física y el Centro de Investigaciones en Inteligencia Artificial, campus Sur, región Xalapa

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

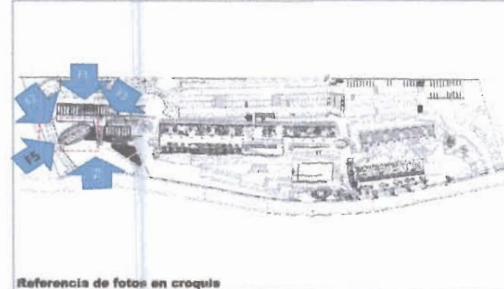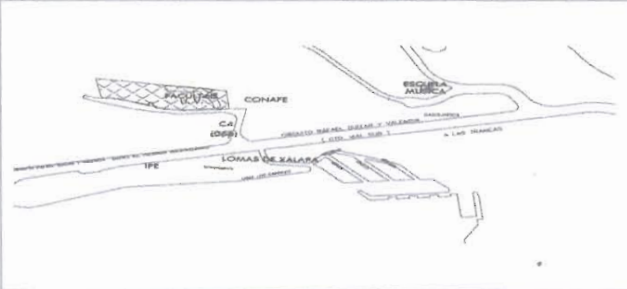

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CALLE PASO No. 112, LOTE II SECC. 2A, LETRA B, COL. DESARROLLO HABITACIONAL NUEVA XALAPA, XALAPA, VER.

FOTOS



F1: VISTA GENERAL



F2: Escaleras

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra concluida



F3: VISTA GENERAL



F4: VISTA GENERAL



F5: VISTA DE ACCESO

Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez

Nombre y firma del Titular de la IES

M. Arq. Emilio P. Rodiles Juárez

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestiño, se podrá copiar tantas pestiños como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (REMANENTE)

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
diciembre 2021
FECHA DE CORTE: 31/12/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Universidad Veracruzana

Porcentaje de avance

100%

Nombre de la obra: **Adaptación de espacios en la USBI Mocambo para aulas de capacitación China- Veracruz, región Veracruz**

CIRCUITO DE LOCALIZACIÓN

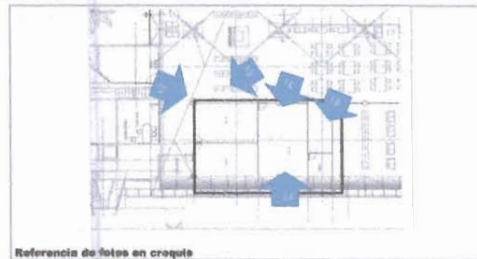

Referencia de fotos en croquis

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO



AV. SS. JUAN PABLO II ENTRE BLVD ADOLFO RUZ CORTIÑES Y JERUS REYES HERÓLES, FRACC. COSTA VERDE, BOCA DEL RIO, VER.

FOTOS



P1



P2

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra concluida



P3



P4



Dr. Martín Omerazo Aguilar Sánchez

Nombre y firma del Titular de la IES

M. Any Elmira P. Rodríguez

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una plantilla, se podrán copiar tantas plantillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial: se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
diciembre_2021

AÑO

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PERMANENTE)

FECHA DE CORTE: 31/01/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Universidad Veracruzana



Porcentaje de avance

100%

PRIMORDIAL 7 Nombre de la obra:

Adopasto en estacionamiento y cubierta de acceso en las Facultades de Matemáticas, Física y el Centro de Investigaciones en Inteligencia Artificial, campus Sur, región Xalapa

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

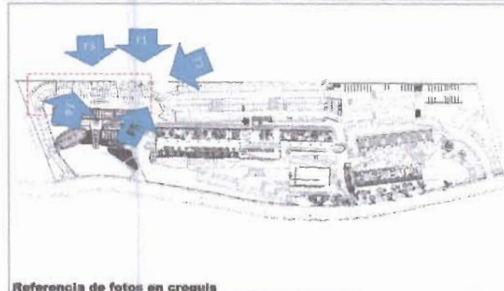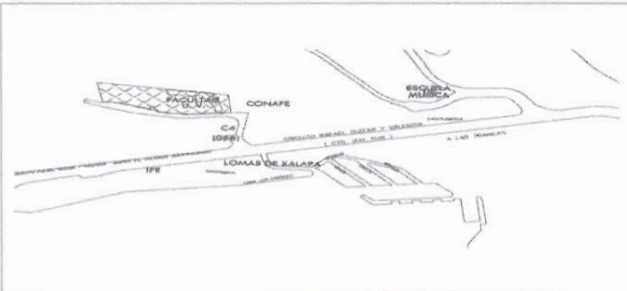

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CALLE PASO No. 112, LOTE II SECC. 3A, LETRA B, COL. DESARROLLO HABITACIONAL NUEVA XALAPA, XALAPA, VER.

FOTOS



F1: VISTA GENERAL




F2: Escaleras

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra concluida



F3: VISTA GENERAL

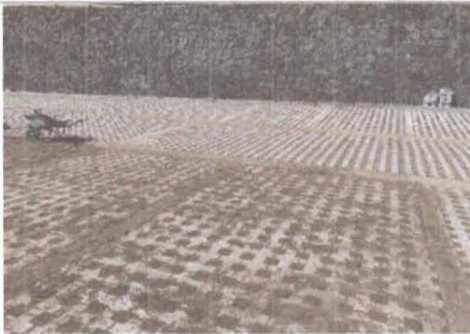

F4: VISTA GENERAL



F5: VISTA DE ACCESO

Dr. Martín Osvaldo Aguilar Sánchez

Nombre y firma del Titular de la IES

M. Arq. Emilio P. Rosales Jasso

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una planilla, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
diciembre_2021
FECHA DE CORTE: 31/12/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Universidad Veracruzana

Porcentaje de avance



100%

PRIOIDAD


B

Nombre de la obra: **Adaptación de espacio para el SAISUV en Orizaba**

CRUQUIS DE LOCALIZACIÓN

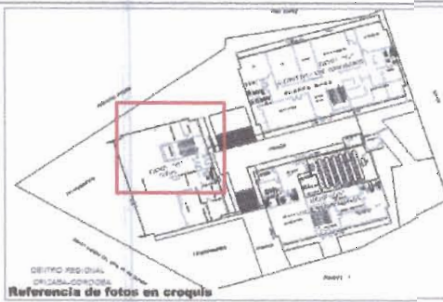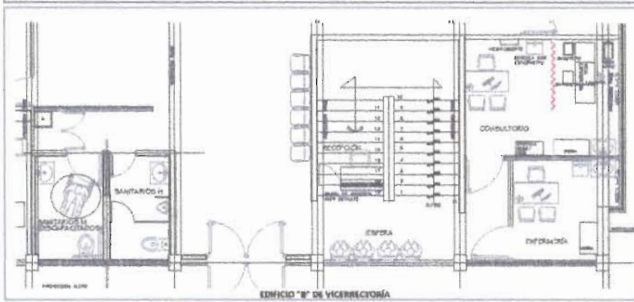

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

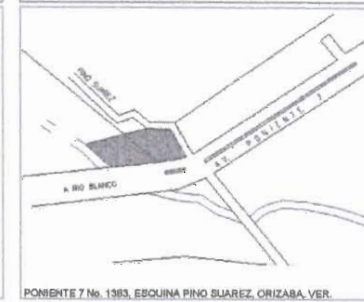

FOTOS



F1: VISTA GENERAL



F2: RECEPCIÓN

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra concluida



F3: VISTA INTERIOR CONSULTORIO



F4: VISTA INTERIOR ENFERMERIA



F5: BAÑOS



Dr. Martín Severo Aguilar Sánchez

Nombre y firma del Titular de la I/ES

M. Arq. Emilia P. Rodiles Julio

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la I/ES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una planilla, se podrá copiar tantas planillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

AJO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PERMANENTES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado:
diciembre_2021
FECHA DE CORTE: 31/01/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL





Universidad Veracruzana

Porcentaje de avance

100%

PROYECTO: 9 Nombre de la obra: **Adaptación de espacio para el SAISUV en Poza Rica**

CRONOGRAMA DE LOCALIZACIÓN

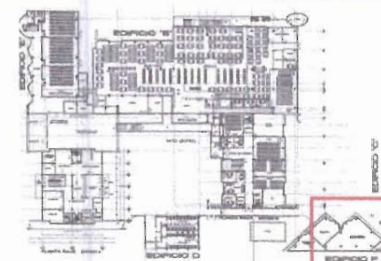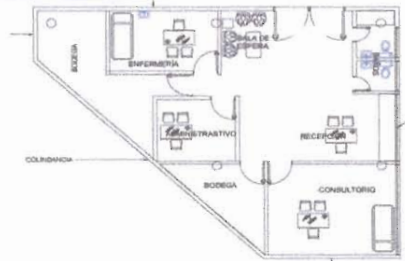

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES N° 308, POZA RICA, VER.

FOTOS



F1: VISTA GENERAL



F2: INTERIOR

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra concluida



F3: VISTA GENERAL



F4: VISTA GENERAL



F5: VISTA GENERAL

Dr. Martín Ovarado Aguilar Sánchez

Nombre y firma del Titular de la IES

M. Arq. Emilio P. Rodiles Castro

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestilaje, se podrán copiar tantas pestilajes como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
diciembre_2021
FECHA DE CORTE: 31/DIC/2021

AÑO

FONDO DE REPORTACIONES MÚLTIPLES (FREMANTI)

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Universidad Veracruzana


Porcentaje de avance

100%

PRORIDAD 10


Nombre de la obra: Adaptación de espacio para el SAISUV en Coatzacoalcos

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

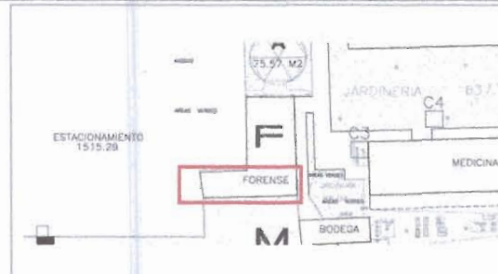

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

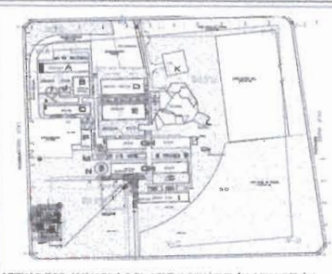


ATENAS ESO. MANAQUA COL. NUEVA MINATITLÁN, MINATITLÁN, VERACRUZ.

FOTOS



F1: VISTA GENERAL

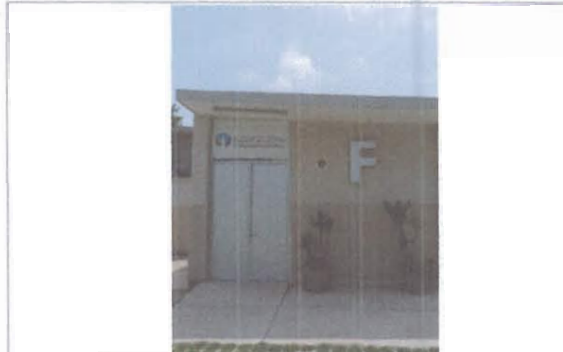

F2: ACCESO

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra concluida



F3: BAÑOS



F4: VISTA INTERIOR



F5: VISTA INTERIOR

Dr. Martín Osorio Aguilar Sánchez

Nombre y firma del Titular de la IES

M. Arq. Emilio P. Rodas Sosa

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (REMANENTE)

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
diciembre_2021
FECHA DE CORTE: 31/12/2021

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Universidad Veracruzana

Fecha de la actividad

Porcentaje de avance

100%



PRORIDAD

11

Nombre de la obra:

Adaptación de espacio de Artes en el CUACC, región Orizaba-Córdoba

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

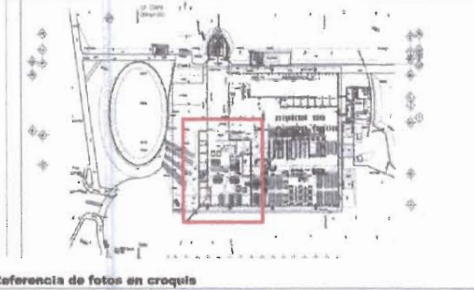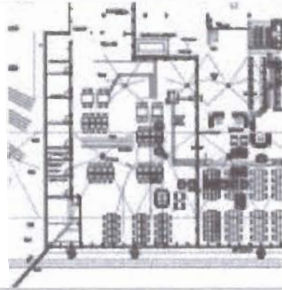

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

croquis de localización:



AV. PROLONGACIÓN BEISBORAMA S/N COL. STA. MARGARITA
(BOULEVARD UNIVERSITARIO, CORDOBA, VER.)

FOTOS



F1: VISTA INTERIOR



F2: ESCALERAS

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra concluida



F3: VISTA CUBICULOS



F4: VISTA GENERAL



F5: VISTA GENERAL

Dr. Martín Gervasio Aguilar Sánchez

Nombre y firma del Titular de la IES

M. Arq. Emilio P. Rodiles Justo

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una planilla, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (REMANENTE)

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
diciembre_2021
FECHA DE CRISTE: 3/01/2021

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Universidad Veracruzana

Porcentaje de avance

100%


PRORIDAD

12

Nombre de la obra:

Sustitución del edificio "A" 2a etapa (obra complementaria) en la Facultad de Ing. Mecánica y Ciencias Navales, región Veracruz.

CRUCES DE LOCALIZACIÓN

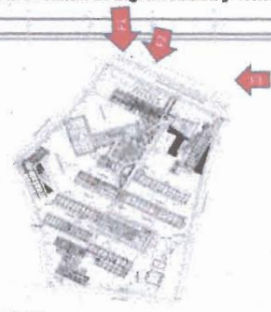

Referencia de fotos en croquis

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO



BLV. ADOLFO RUIZ CORTINES S/N, FRACCIONAMIENTO COSTA VERDE, BOCA DEL RIO, VER.

FOTOS



F1: FACHADA EDIFICIO A



F2: FACHADA EDIFICIO A



F3: FACHADA EDIFICIO A



F4: FACHADA EDIFICIO A

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra concluida

Dr. Martín Gerardo Aguilera Sánchez

Nombre y firma del Titular de la IES

M. Arg. Estelita P. Rodríguez

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña. se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (REMANENTE)

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

diciembre_2021

FECHA DE CORTE: 31/12/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Universidad Veracruzana

Porcentaje de avance

83%

PRIMORDIAL

13

Nombre de la obra:

Sustitución de edificio "B" 2a etapa (obra complementaria) en la Facultad de Ingeniería Mecánica, para la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, región Veracruz

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO



BLV. ADOLFO RUIZ CORTINES S/N, FRACCIONAMIENTO COSTA VERDE, BOCA DEL RIO, VER.

FOTOS



P1: CONEXIÓN VOZ Y DATOS EN MESAS DE CÓMPUTO



P2: CONEXIÓN VOZ Y DATOS EN MESAS DE CÓMPUTO

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra en proceso



P3: SONOMUROS EN SALA DE VIDEOCONFERENCIAS



P4: SONOMUROS EN SALA DE VIDEOCONFERENCIAS



P5: SONOMUROS EN SALA DE VIDEOCONFERENCIAS

Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez

Nombre y firma del Titular de la IES

M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una plantilla, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar, para el antes, durante y después de la obra.

2020

AÑO

FAM

FO FONTOACIONES MÚLTIPLES (REMANE)

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
diciembre_2021

FECHA DE Corte: 31/12/2021

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Universidad Veracruzana



Porcentaje de avance

100%

PRORIDAD 14 Nombre de la obra:

Trabajos complementarios en el edificio para las facultades de Matemáticas, Física y el Centro de Investigaciones en Inteligencia Artificial, campus Sur, región Xalapa.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

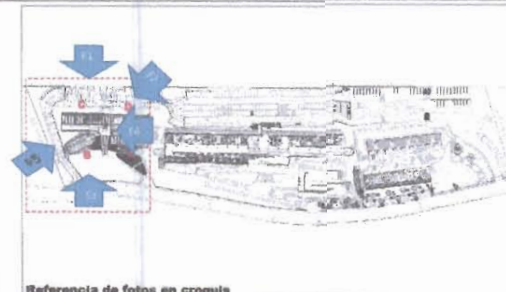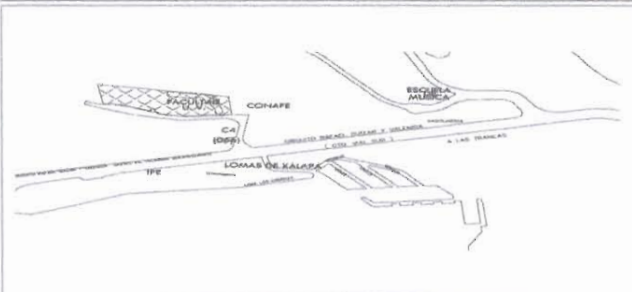

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CALLE PASEO No. 112, LOTE II SECC. 2A, LETRA B, COL. DESARROLLO HABITACIONAL NUEVA XALAPA, XALAPA, VER.

FOTOS



F1: Edificio A y E: Fachada Posterior



F2: Edificio A: Fachada Interior



F3: Edificio E: Fachada Principal



F4: Edificio D: Fachada Posterior

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra concluida



F5: Edificio C: Fachada Exterior

Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez
Nombre y firma del Titular de la IES

H. Arq. Emilio P. Rodiles Justo
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se genere reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se genera una planilla, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, de especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra
