

2021

AÑO

**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (REMANENTES)

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**marzo 2022**  
FECHA DE CORTE: 31/MAR/2022

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: **Universidad Veracruzana**  
Entidad Federativa: Veracruz  
Clave Inst 911: 38R6J00408



Universidad Veracruzana  
Escudo de la Universidad

Nombre: **Mtra. Norma Angelina Lagunes López**  
Cargo: Encargada de la Dirección de Planeación Institucional  
Teléfono: (228) 8421700 EXT. 12716  
Correo electrónico: [nlagunes@uv.mx](mailto:nlagunes@uv.mx)

RESPONSABLES

Nombre: **M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo**  
Cargo: Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento  
Teléfono: (228) 8421700 EXT. 12709  
Correo electrónico: [erodiles@uv.mx](mailto:erodiles@uv.mx)

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>			Acciones que sustentan el avance <sup>2</sup>	Acciones por realizar	% de avance	Fecha <sup>3</sup>		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada						
		Obra de construcción	Equipamiento	Asesorías y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustantivable	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Termino	Entrega- Recepción (Acta finalizado)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa	Cuenta con Actas		
																							¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	
GLOBAL DEL PROYECTO																									
1	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física y el Centro de Investigaciones en Inteligencia Artificial, región Xalapa (red de media tensión)	X				\$ 2,895,064.10	\$ 2,740,218.47	\$ 154,845.63	Aidas	6	374.00	Obra concluida		100	17/09/21	15/01/22		SI	Rectore Dra. Sara D. Ledón de Guayara González. 18/jun/21						
									Servicio	1	49.00														
									Áreas comunes	1	130.00														
									Site	1	12.00														
									<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>564.00</b>														
2	Construcción del edificio para la Facultad de Matemáticas, Física y el Centro de Investigaciones en Inteligencia Artificial, Región Xalapa (Obra eléctrica, pluvial, Hidrosanitaria y acabados), Etapa 1, Complemento de recursos 1	X				\$ 812,477.96	\$ -	\$ 812,477.96	Aidas	2	259.00	Obra concluida		100	29/12/21	04/03/22		SI	Rectore Dra. Sara D. Ledón de Guayara González. 10/jun/21						
									Talleres	8	496.00														
									Servicio	1	47.00														
									Áreas comunes	1	321.00														
									Site	1	14.00														
									<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>1136.00</b>														
3	Obra exterior y trabajos complementarios para el edificio del Centro de Investigaciones Biomédicas, región Xalapa.	X				\$ 600,000.00	\$ -	\$ 600,000.00	Cisternas	1	8 m3	Obra por iniciar	Tramitar anticipo	0	05/04/22	19/05/22									
									Acabados	1	50.06														
									Relacionamiento	1	289.00														
									<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>336.06</b>														
4	Instalación de obra eléctrica para conexión de transformador con línea de CFE en la Galería "Ramón Alva de la Canal"	X				\$ 600,000.00	\$ -	\$ 600,000.00	Obra eléctrica	1	140 ML.	Obra por iniciar	Tramitar anticipo	0	05/04/22	05/05/22									
5	Construcción de barda perimetral noroeste y grada en cancha de básquetbol en el Campus Coatzacoacoas, Región Coatzacoacoas-Minatitlán	X				\$ 1,100,000.00	\$ -	\$ 1,100,000.00	Bardas y grada	1	319.00	Obra por iniciar	Tramitar anticipo	0	05/04/22	06/06/22									
6	Ampliación de red de media tensión en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales para los edificios "A" y "B", región Veracruz	X				\$ 2,847,499.91	\$ -	\$ 2,847,499.91	Instalación bajo y media tensión	1	190 ML.	Obra por iniciar	Tramitar anticipo	0	15/04/22	15/07/22									
7	Construcción del edificio para la Facultad de Matemáticas, Física y el Centro de Investigaciones en Inteligencia Artificial, Región Xalapa (Obra eléctrica, pluvial, Hidrosanitaria y acabados), Etapa 1.	X				\$ 3,019,271.48	\$ -	\$ 3,019,271.48	Acondicionamiento de aulas	16	866.86	Obra por iniciar	Tramitar anticipo	0	15/04/22	15/07/22									
									Acondicionamiento de laboratorios	13	963.79														
									Acondicionamiento de bibliotecas	22	827.88														
									Acondicionamiento de biblioteca	1	263.74														
									Obra exterior	1	236.82														
									<b>TOTAL</b>	<b>53</b>	<b>2862.39</b>														
						<b>\$11,674,498.66</b>	<b>\$2,740,218.47</b>	<b>\$8,934,280.19</b>																	

Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez  
Nombre y firma del Titular de la IES

M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se capturan los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán omitir tanto filas como sea necesario.  
2 En esta sección se redacta de forma breve y concisa los trabajos a realizar, además que se verán reflejados en el reporte fotográfico.  
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en día digital: día, mes y año.

2021

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (REMANENTES)

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

marzo 2022

FECHA DE CORTE: 31/03/2022

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Universidad Veracruzana

Estado de Veracruz

Porcentaje de avance

100%



PRIORIDAD

1

Nombre de la obra:

Construcción del edificio para las Facultades de Matemática, Física y el Centro de Investigaciones en Inteligencia Artificial, región Xalapa (red de media tensión)

CRUCES DE LOCALIZACIÓN

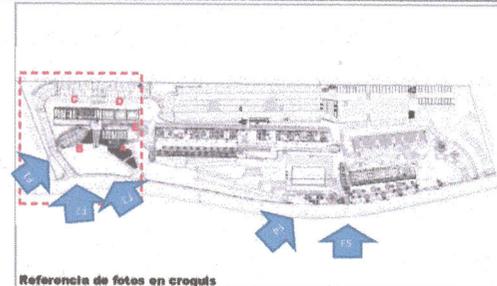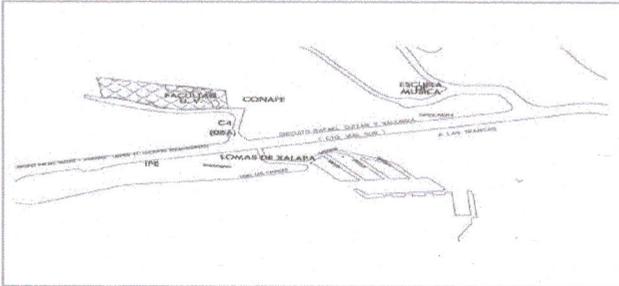

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CALLE PASEO No. 112, LOTE II SECC. 2A, LETRA B, COL. DESARROLLO HABITACIONAL NUEVA XALAPA, XALAPA, VER.

FOTOS



F1: Edificio (B) Entrada principal



F2: Vista Exterior Facultad



F3: Edificio (B) Transformadores



F4: Vista General

Comentarios de los trabajos realizados:  
  
Obra concluida



F5: Estacionamiento Área de medición

Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez

Nombre y firma del Titular de la IES

M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial: se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2021

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (REMANENTES)

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

marzo\_2022

FECHA DE CORTE: 31/MAR/2022

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Universidad Veracruzana

Estado de la Universidad

Porcentaje de avance

100%



PRIORIDAD

2

Nombre de la obra:

Construcción del edificio para la Facultad de Matemáticas, Física y el Centro de Investigaciones en Inteligencia Artificial, Región Xalapa (Obra eléctrica, pluvial, hidro-sanitaria y acabados). Etapa 1. Complemento de recursos 1

CRUQUE DE LOCALIZACIÓN

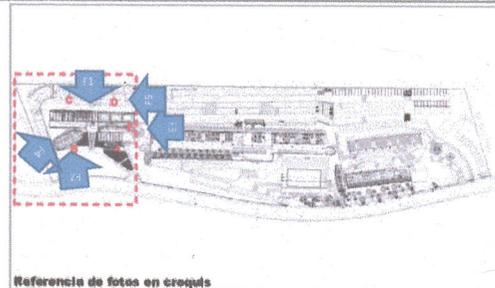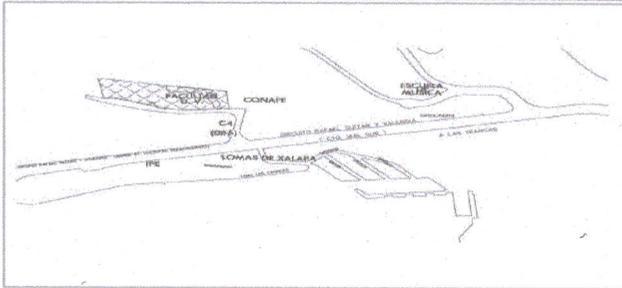

Referencia de fotos en cruque

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CALLE PASEO No. 112, LOTE II SECC. 3A, LETRA B, COL. DESARROLLO HABITACIONAL NUEVA XALAPA, XALAPA, VER.

FOTOS



F1: Azotea



F2: Cubículos último nivel Edificio B

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra concluida



F3: Equipo de control de bombeo



F4: Edificio B y C



F5: Edificio A y D

Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez

Nombre y firma del Titular de la IES

M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2021


# FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**marzo\_2022**  
FECHA DE CORTE: 31/MAR/2022

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES REMANENTES

### REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

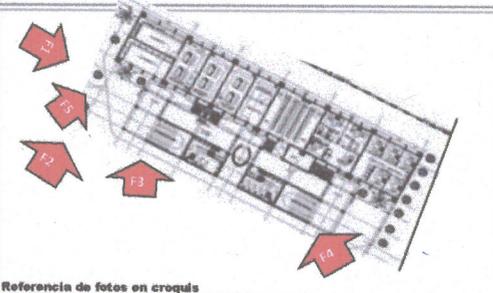 Universidad Veracruzana <small>Estado de la universidad</small> Porcentaje de avance <h1>0%</h1>	PRIORIDAD <b>3</b> Nombre de la obra: <b>Obra exterior y trabajos complementarios para el edificio del Centro de Investigaciones Biomédicas, región Xalapa.</b>	
	<b>CROQUIS DE LOCALIZACIÓN</b> 	<b>UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO</b>  <small>CIRCUITO VERACRUZ No 5 COL. INDUSTRIAL ANIMAS, XALAPA, VER.</small>
	 Referencia de fotos en croquis	

### FOTOS



F1: Fachada



F2: Fachada lateral izquierda



F3: planta baja



F4: fachada trasera

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra por iniciar



F5: Fachada principal

Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez

Nombre y firma del Titular de la IES

M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial: se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2021

AÑO

# FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (REMANENTES)

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE PORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

marzo 2022

FECHA DE CORTE: 31/MAR/2022

### REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

4

Nombre de la obra:

Instalación de obra eléctrica para conexión de transformador con línea de CFE en la Galería "Ramón Alva de la Canal"





Universidad Veracruzana

Porcentaje de avance


0%

#### CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

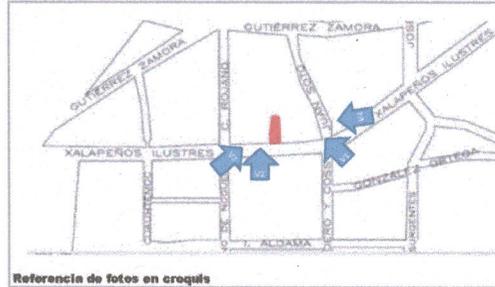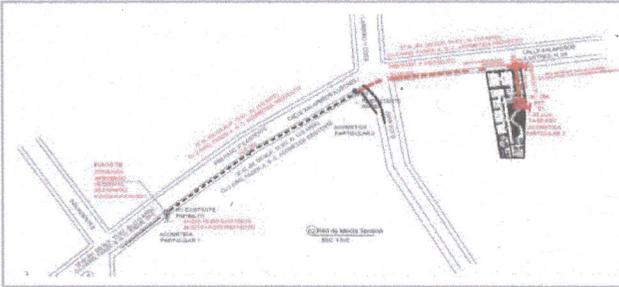

Referencia de fotos en croquis

#### UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

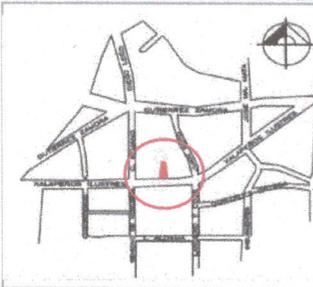

#### FOTOS



F1: Vista de la calle



F2: Vista general fachada



F3: Vista de la calle



F4: Vista de la calle

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra por iniciar

Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez

Nombre y firma del Titular de la IES

M. Arq. Emilia P. Rodiles Jasso

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2021

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
marzo\_2022

FECHA DE CORTE: 31/MAR/2022

AÑO

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (REMANENTES)

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Universidad Veracruzana

Porcentaje de la ejecución

Porcentaje de avance

0%


PRIORIDAD

5

Nombre de la obra:


Construcción de barda perimetral noroeste y grada en cancha de basquetbol en el Campus Coatzacoalcos, Región Coatzacoalcos-Minatitlán

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

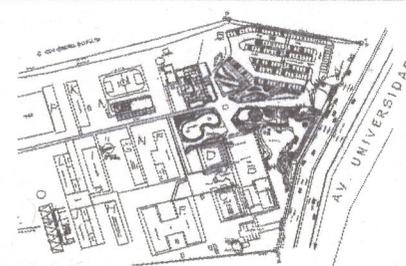

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



AV. UNIVERSIDAD SIN CARRETERA A MINATITLÁN KM. 7.5, COATZACOALCOS, VER.

FOTOS



F1: Fachada



F2: Fachada frontal posterior




F3: vista cubo elevador



F4: fachada trasera

Comentarios de los trabajos realizados:  
  
Obra por iniciar

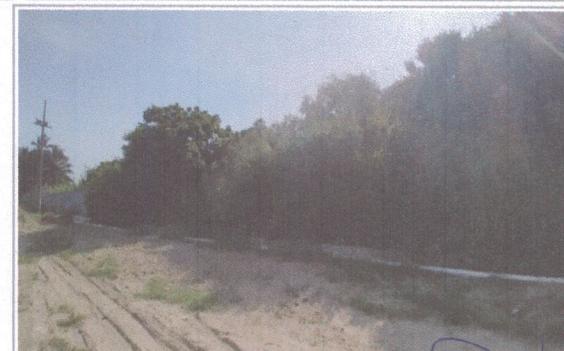

F5: Fachada principal lateral

Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez  
Nombre y firma del Titular de la IES

M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2021

AÑO

**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (REMANENTES)

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

marzo\_2022

FECHA DE CORTE: 31/03/2022

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Universidad Veracruzana

Estado de la Universidad

Porcentaje de avance

0%



PRIORIDAD

6

Nombre de la obra:

**Ampliación de red de media tensión en la facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales para los edificios "A" y "B", región Veracruz**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

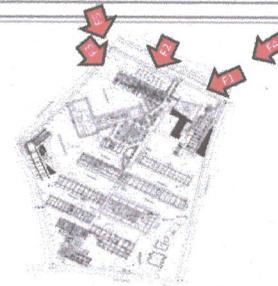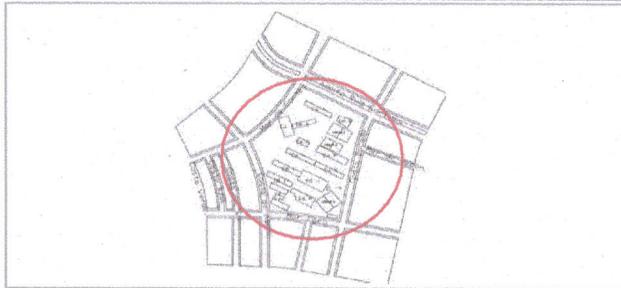

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO




BLV. ADOLFO RUIZ CORTINES S/N, FRACCIONAMIENTO COSTA VERDE, BOCA DEL RIO, VER.

FOTOS



F1: FACHADA EDIFICIO A

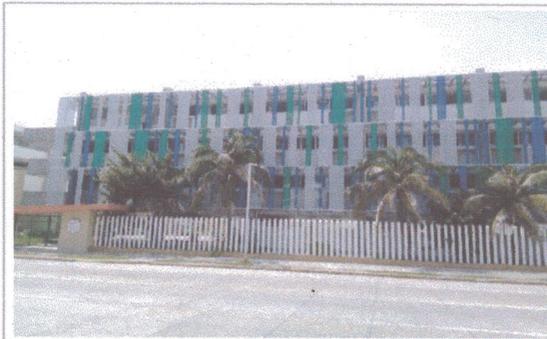

F2: FACHADA EDIFICIO A



F3: FACHADA EDIFICIO A



F4: FACHADA EDIFICIO A

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra por iniciar



FOTO 5: FACHADA EDIFICIO A

Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez

Nombre y firma del Titular de la IES

M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2021

# FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (REMANENTES)

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**marzo\_2022**  
FECHA DE CORTE: 31/03/2022

### REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL





Porcentaje de avance  
**0%**

PRIORIDAD **7** Nombre de la obra:

**Construcción del edificio para la Facultad de Matemáticas, Física y el Centro de Investigaciones en Inteligencia Artificial, Región Xalapa (Obra eléctrica, pluvial, hidrosanitaria y acabados). Etapa 2.**


#### CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

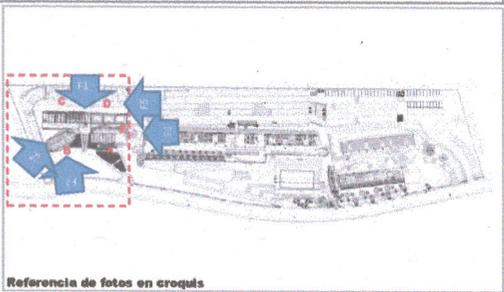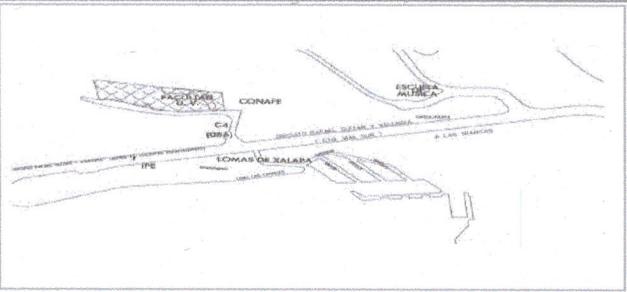

#### UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO



### FOTOS

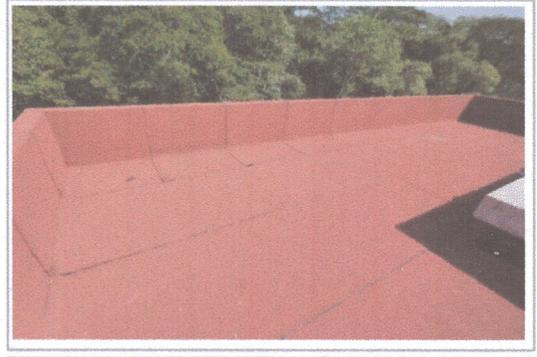

F1: Azotea




F2: Cubículos último nivel Edificio B

Comentarios de los trabajos realizados:  
Obra por iniciar



F3: Equipo de control de bombeo

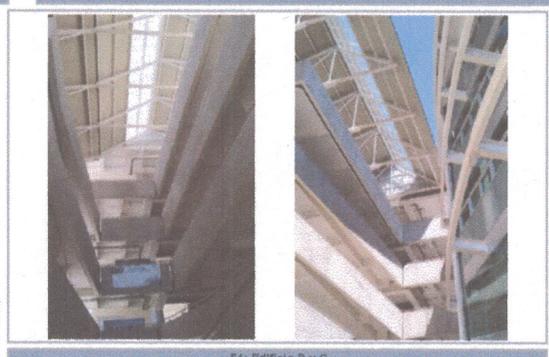

F4: Edificio B y C



F5: Edificio A y D

**Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez**  
Nombre y firma del Titular de la IES

**M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo**  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestañita, se podrán copiar tantas pestañitas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
