

2021

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
diciembre 2022
FECHA DE CORTE: 31/12/2022

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: **Universidad Veracruzana**
Entidad Federativa: Veracruz
Clave Fed: 911 30MSU06406



Universidad Veracruzana
Facultad de la Universidad

RESPONSABLES

Planificación
Nombre: Mtra. Norma Angélica Lagunes López
Cargo: Encargada de la Dirección de Planificación Institucional
Teléfono: (228) 8431700 EXT. 12718
Correo electrónico: nlagunes@uv.mx

Obras y Mantenimiento
Nombre: Arq. Miguel Ángel Cano Asseleh
Cargo: Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento
Teléfono: (228) 8431700 EXT. 12702
Correo electrónico: mcano@uv.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejecutado	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurado? (Causas)	Si ya fue inaugurada				
		Obra de construcción	Mantenimiento	Ampliación y mejoras	Proyecto sustanciado				Especial/equipo	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término			Cuenta con Actas				
																			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Cuándo y dónde inauguró?	Entrega-Recpción (Acto físico)	Acta Administrativa de Entrega-Recpción	Monto de Acta Administrativa
GLOBAL DEL PROYECTO																							
1	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física y el Centro de Investigaciones en Inteligencia Artificial, región Xalapa (red de media tensión) Complemento de recursos 1	X				\$ 245.33	\$ 245.33	\$ -	Obra media tensión	1	330 ML	Obra concluida	100	17/09/21	15/01/22		Si	Rectora Dra. Silvana O. León de Guzmán González, 18/Jan/21	Si	Si	\$245.33		
2	Construcción del edificio de la Facultad de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, región Xalapa (Obra eléctrica, pluvial, hidro-sanitaria y acabados). Etapa 1. Complemento de recursos 2	X				\$ 267.08	\$ 267.08	\$ -	Obra eléctrica (biblioteca) Obra pluvial Obra hidro-sanitaria Acabados	1 1 1 1	250.00 230.00 230.00 65.00	Obra concluida	100	29/12/21	04/03/22	El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFPLAN) notificó a la Universidad Veracruzana la asignación de recursos del FAM 2021 Remanente Rendimientos Financieros 1a, ministración mediante of. no. SFP/0677/2021 de fecha 25/Jun/2021 por \$245.33. La 2a. ministración mediante of. no. SFP/0827/2021 de fecha 30/Jun/2021 por \$267.08. La 3a. ministración mediante of. no. SFP/1151/2021 por \$17,485.29. La 4a. ministración mediante of. no. SFP/1438/2021 de fecha 24/nov/21 por \$10,847.12. La 5a. de y 7a. ministraciones fueron notificadas mediante of. no. SFP/1511/2021 por \$267.8115/30/21; SFP/1610/2021 por \$4984.09 (23/Dic/21) y SFP/1667/2021 por \$629.96 (27/Dic/21). La 8a. ministración mediante of. no. SFP/0661/2022 de fecha 13/ene/2022 por \$21,077.96. La 9a. ministración mediante of. no. SFP/0626/2022 de fecha 16/Jun/2022 por \$4,303.89. Los recursos en su totalidad ya fueron radicados a la Universidad Veracruzana.	Si	Rectora Dra. Silvana O. León de Guzmán González, 18/Jun/21	Si	Si	\$267.08		
3	Construcción de cubículos en planta alta de edificio "R" (CIDEA) del Centro de Institutos, región Xalapa. Complemento de recursos 2	X				\$ 17,485.29	\$ 17,485.29	\$ -	Cubículos	11	140.00	Obra concluida	100	29/12/21	11/02/22	No, ya que se trata de una etapa de la planta alta del edificio	Si	Si	\$17,485.29				
4	Construcción de sistemas para almacenamiento de agua pluvial en la Unidad de Ciencias de la Salud en Minatitlán, región Coahuila-Coahuila-Minatitlán (complemento de recursos 2)		X			\$ 10,847.12	\$ 94.27	\$ 9,905.85	Sistemas	2	9e3	Obra concluida.	100	20/12/21	18/01/22	No, solo se trata de infraestructura complementaria	Si	Si	\$94.27				
5	Ampliación de red de media tensión en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales para los edificios "A" y "B", región Veracruz. Complemento de recursos.	X				\$ 6,181.85	\$ 6,181.85	\$ -	Instalación baja y media tensión	1	190 ML	Obra concluida.	100	11/07/22	07/12/22	No, solo se trata de infraestructura complementaria	Si	Si	\$6,181.85				
6	Mantenimiento a cubierta y estructura del 2do. nivel de la Facultad de Psicología, región Veracruz (complemento de recursos 1)		X			\$ 25,381.80	\$ 25,381.80	\$ -	Mantenimiento a cubierta	1	139.12	Obra concluida.	100	07/12/22	04/02/23	No, solo se trata de mantenimiento	Si	Si	\$25,381.80				
						\$86,489.47	\$86,592.62	\$8,905.85															

Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez
Nombre y firma del Titular de la IES

Arq. Miguel Ángel Cano Asseleh
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se checklist a los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tantas filas como sea necesario.
2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2021

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PERMANENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS)

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
diciembre_2022

FECHA DE CORTE: 31/12/2022

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



PRORIDAD

1

Nombre de la obra:

Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física y el Centro de Investigaciones en Inteligencia Artificial, región Xalapa (red de media tensión)
Complemento de recursos 1

CRONOGRAMA DE LOCALIZACIÓN

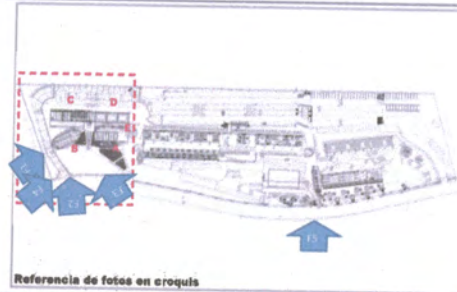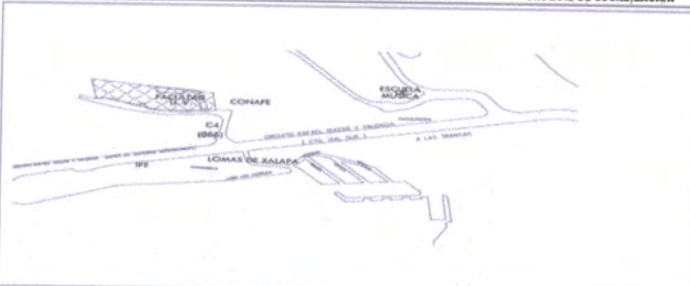

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CALLE PASEO No. 112, LOTE II SECC. 3A, LETRA B, COL. DESARROLLO HABITACIONAL NUEVA XALAPA, XALAPA, VER.



Universidad Veracruzana

Avance de la universidad

Porcentaje de avance

100%

FOTOS



F1: Edificio (B) Entrada principal



F2: Vista Exterior Facultad



F3: Edificio (B) Transformadores



F4: Vista General

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra concluida



F5: Estacionamiento Área de medición

Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez

Nombre y firma del Titular de la IES

Arq. Miguel Ángel Cano Asseleh

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2021

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
diciembre_2022
FECHA DE CORTE: 31/01/2022

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (REMANENTES RENDIMIENTOS FINANCIEROS)

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Universidad Veracruzana

Porcentaje de avance

100%



PRIMORDIAL

2

Nombre de la obra:

Construcción del edificio de la Facultad de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, Región Xalapa (Obra eléctrica, pluvial, hidrosanitaria y acabados), Etapa 1. Complemento de recursos 2

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

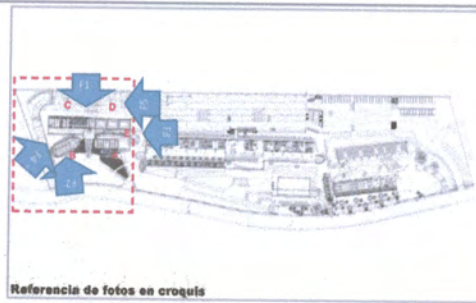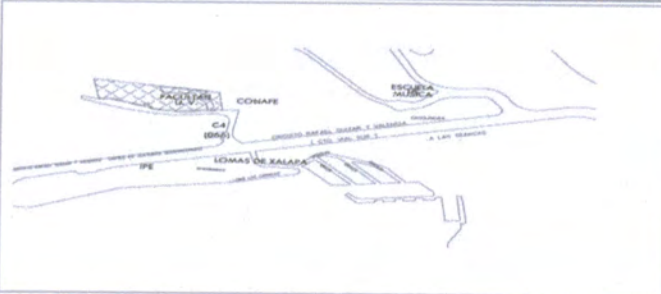

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CALLE PASEO No. 112, LOTE II SECC. 2A, LETRA B, COL. DESARROLLO HABITACIONAL NUEVA XALAPA, XALAPA, VER.

FOTOS




F1: Azotes



F2: Cubículos ultimo nivel Edificio B



F3: Equipo de control de bombeo

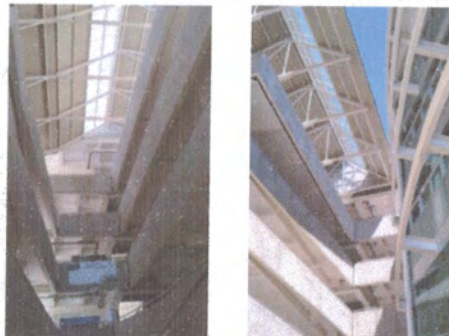

F4: Edificio B y C

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra concluida



F5: Edificio A y D

Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez

Nombre y firma del Titular de la IES

Arq. Miguel Ángel Cano Asseleh

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2021

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (REMANENTES RENDIMIENTOS FINANCIEROS)

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

diciembre_2022

FECHA DE CORTE: 31/01/2022

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Universidad Veracruzana

Nombre de la institución

Porcentaje de avance

100%


PROYECTO

3

Nombre de la obra:

Construcción de cubículos en planta alta de edificio "K" (CIDEA) del Centro de Institutos, región Xalapa. Complemento de recursos 2

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

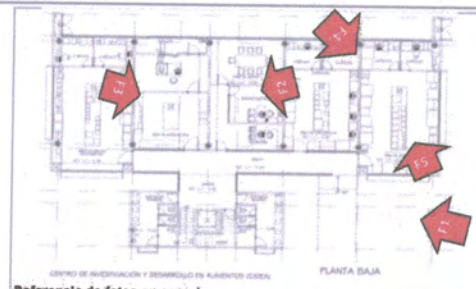

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CIRCUITO VERACRUZ No 5 COL. INDUSTRIAL ANIMAS, XALAPA, VER

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: Área de cubículos

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra concluida



F3: Área de cubículos



F4: Vista general primer nivel Posgrados



F5: Primer nivel posgrados

Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez

Nombre y firma del Titular de la IES

Arq. Miguel Ángel Cano Asseleh

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2021

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
diciembre 2022
FECHA DE CORTE 31/DEC/2022

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (REMANENTES RENDIMIENTOS FINANCIEROS)

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Universidad Veracruzana

Porcentaje de avance

100%



PRORIDAD

4

Nombre de la obra:

Construcción de cisternas para almacenamiento de agua pluvial en la Unidad de Ciencias de la salud en Minatitlán, región Coatzacoalcos- Minatitlán (complemento de recursos 2)

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

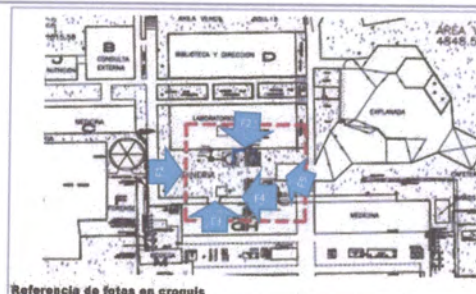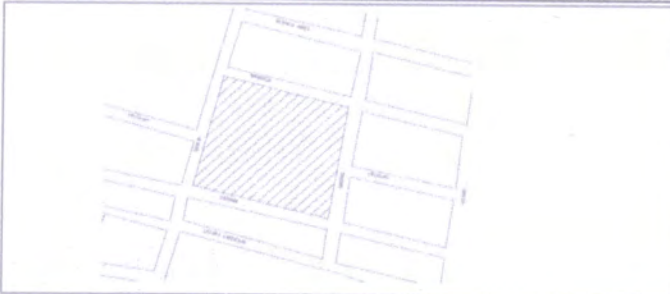

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



MANAQUA EQ. BERLÍN, MADRID, PANAMÁ, COL. NUEVA MINATITLÁN, MANZ. 27 Y 31, MINATITLÁN, VER.

FOTOS



F1: Vista Exterior frontal



F2: Vista Exterior lateral



F3: Vista Exterior lateral



F4: Vista Exterior posterior

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra concluida



F5: Vista Exterior posterior

Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez

Nombre y firma del Titular de la IES

Arq. Miguel Ángel Cano Asseleth

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestiña, se podrán copiar tantas pestiñas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2021

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (REMANENTES REFINANCIADOS)

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

diciembre_2022

FECHA DE CORTE: 31/12/2022

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Universidad Veracruzana

Escuela de la universidad

Porcentaje de avance

100%

PROGRESO: 5

Nombre de la obra:

Ampliación de red de media tensión en la facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales para los edificios "A" y "B", región Veracruz. Complemento de recursos.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

BIV. ADOLFO RUIZ CORTINES S/N. FRACCIONAMIENTO COSTA VERDE. BOCA DEL RÍO, VER.

FOTOS



F1: En esta fotografía se observa que el transformador y el equipo de medición ya fueron montados sobre sus bases de concreto. Estos equipos se encuentran sobre la banqueta de la calle Costa Dorada.



F2: En esta fotografía se observa que el transformador de 800 KVA ya fue instalado sobre la base prefabricada. A la izquierda de la foto se observa el cuarto de tableros ya terminado, solo esperando la aplicación de la pintura exterior.

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra concluida



F3: En esta fotografía se observa el transformador ya colocado, así como el cuarto de tableros terminado, solo esperando la pintura exterior.



F4: En esta fotografía se observa el gabinete donde se colocaran las barras derivadoras. Dicho gabinete ya se encuentra terminado solo está a la espera de la aplicación de la pintura exterior.



F5: Bases de concreto ya terminadas y transformador y equipo de medición ya montados sobre ellas.

Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez

Nombre y firma del Titular de la IES

Arq. Miguel Ángel Gano Asseleh

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestañita, se podrán copiar tantas pestañitas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2021

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (REMANENTES REINVENTOS FINANCIEROS)

Mes reportado
diciembre 2022
FECHA DE CORTE: 31/12/2022

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Universidad Veracruzana


Porcentaje de avance

100%

Nombre de la obra: **Mantenimiento a cubierta y estructura del 2do. nivel de la Facultad de Psicología, región Veracruz (complemento de recursos 1)**

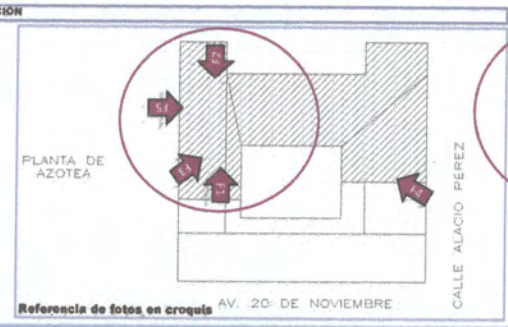

FOTOS

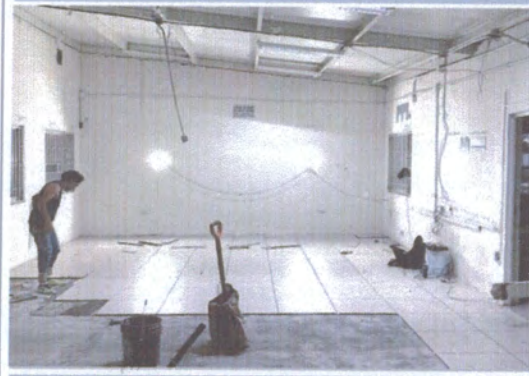

F1: Fotografía tomada desde el interior de la biblioteca donde se observa la cubierta ya colocada, así como la colocación del piso cerámico en la misma área.



F2: Fotografía tomada desde el interior de la biblioteca donde se observa la cubierta ya colocada, así como la colocación del piso cerámico en la misma área.

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra concluida




F3: Cubierta multipanel ya reparada y colocada vista desde la cubierta misma.




F4: Cubierta multipanel ya reparada y colocada vista desde la cubierta misma.



F5: Cubierta multipanel ya reparada y colocada vista desde la cubierta misma.


Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez
Nombre y firma del Titular de la IES


Arq. Miguel Angel Cano Asseleh
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial: se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
