

2021

AÑO

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**marzo 2022**  
FECHA DE CORTE: 31/03/2022

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Universidad Veracruzana  
Escudo de la universidad

Nombre: **Universidad Veracruzana**  
Entidad Federativa: Veracruz  
Clave Inel 911: 30MS000406

RESPONSABLES

Planteación  
Nombre: Mra. Norma Angélica Lagunes López  
Cargo: Encargada de la Dirección de Planteación Institucional  
Teléfono: (228) 8421700 EXT. 12718  
Correo electrónico: nlagunes@uv.mx

Obras y Mantenimiento  
Nombre: M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo  
Cargo: Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento  
Teléfono: (228) 8421700 EXT. 12702  
Correo electrónico: erodiles@uv.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>			Acciones que sustentan el avance <sup>2</sup>	Acciones por realizar	% de avance	Fechas <sup>3</sup>		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas			
		Obras de infraestructura	Equipamiento	Adquisiciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto académico	Especie/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Termino	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega- Recepción (Acta físico)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción	Monto de Acta Administrativa
4	Construcción 1er. Nivel del edificio "O" en la Facultad de Ciencias Químicas, región Coscazacoatlán- Minatitlán.	X				\$ 9,000,000.00	\$ 8,983,034.07	\$ 16,965.93	Ases	6	374.00	Obra concluida	100	18/08/21	04/01/22		Si		Si	Si	\$8,983,034.07			
2	Construcción 3a etapa de módulo de aulas en la Facultad de Arquitectura, región Poza Rica- Tuxpan.	X				\$ 15,000,000.00	\$ 14,987,188.10	\$ 12,811.90	Ases	2	253.00	Obra concluida	100	14/09/21	12/03/22	La asignación de recursos del FAM 2021 fue informada por la D.G.E.S.U. mediante of. Núm. 511/2021-0908-33 con fecha 19/09/21. A la fecha, la SEPPLAN ha realizado la totalidad de los recursos a la UV de acuerdo al calendario de ministraciones mensuales.	No, ya que la 1a etapa ya fue inaugurada.	Si	Rebecca Dra. Sara D. Ludovico de Guzman Quetzil, 03/03/21	Si	Si	\$14,987,188.10		
5	Construcción 1er. Nivel en el edificio del Centro de Investigaciones Biomédicas, región Xalapa.	X				\$ 7,282,100.98	\$ 6,986,133.54	\$ 1,001,967.12	Ases	6	374.00	Obra concluida	100	22/09/21	24/03/22		No, ya que la 1a etapa ya fue inaugurada.	Si	Rebecca Dra. Sara D. Ludovico de Guzman Quetzil, 03/03/21	Si	Si	\$6,986,133.54		
						<b>\$31,282,100.98</b>	<b>\$30,256,895.71</b>	<b>\$1,025,205.27</b>	<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>888.00</b>													

Nota: Con este reporte se comprueba el ejercicio de la totalidad de los recursos existiendo un remanente de \$1,025,205.27 entregado a la TESOF.

Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez  
Nombre y firma del Titular de la IES

M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se capturan los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanto fotos como sus respectivos.  
2 En esta sección se redactará de forma breve y completa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.  
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2021

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

marzo\_2022

FECHA DE CORTE: 31/MAR/2022

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Universidad Veracruzana

Porcentaje de avance

100%



PRIMORDIAL

1

Nombre de la obra:


Construcción 1er. Nivel del edificio "O" en la Facultad de Ciencias Químicas, región Coatzacoalcos-Minatitlán.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

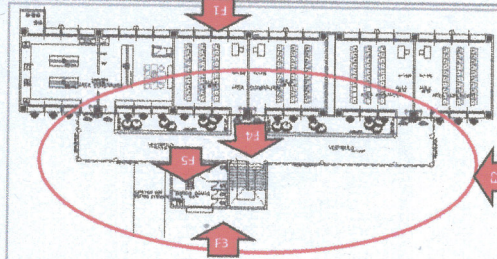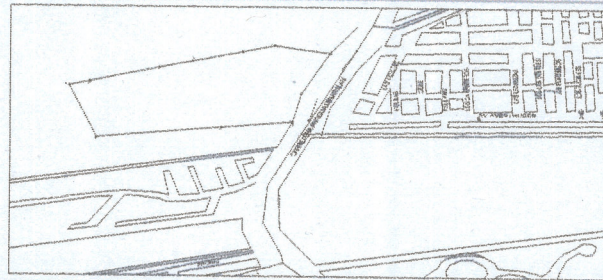

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



AV. UNIVERSIDAD S/N (CARRETERA A MINATITLÁN KM. 7.5)  
COATZACOALCOS VER.

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra concluida

Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez

Nombre y firma del Titular de la IES

M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2021

AÑO

**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

marzo\_2022

FECHA DE CORTE: 31/03/2022

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Universidad Veracruzana

Localidad: Veracruz

Porcentaje de avance  
**100%**



PRIORIDAD

2


Nombre de la obra:

Construcción 3a etapa de módulo de aulas en la Facultad de Arquitectura, región Poza Rica-Tuxpan.

CRUQUIS DE LOCALIZACIÓN

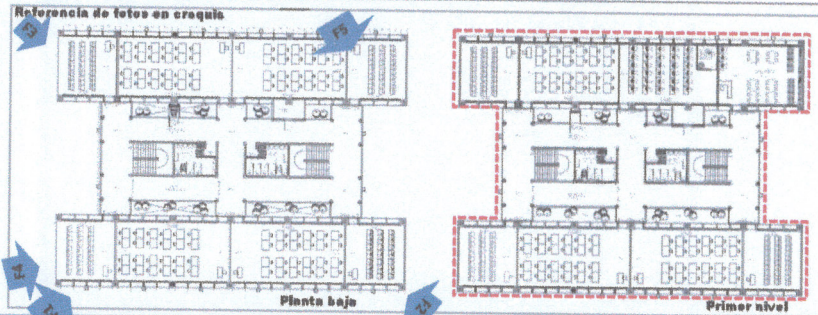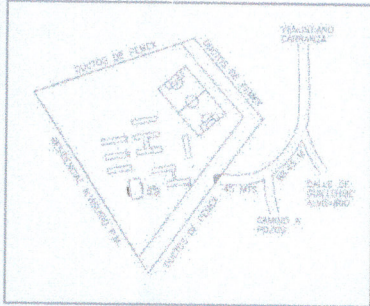

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

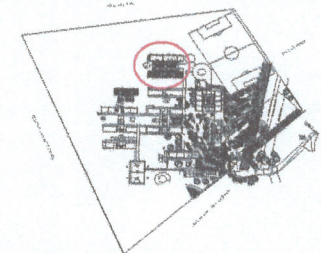

PROL. AV. VENUSTIANO CARRANZA SIN PARCELA 43, COL. REVOLUCIÓN, POZA RICA, VER.

FOTOS



F1: Fachada sur (segundo nivel).



F2: Fachada este (segundo nivel)



F3: Fachada Norte (segundo nivel)



F4: Fachada Oeste (segundo nivel)

Comentarios de los trabajos realizados:  
Obra concluida



F5: Interior (segundo nivel)

Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez

Nombre y firma del Titular de la IES

M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2021

AÑO

# FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

marzo\_2022

FECHA DE CORTE: 31/MAR/2022

### REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Universidad Veracruzana

Porcentaje de avance


# 100%

PRORIDAD

Nombre de la obra:


**Construcción 1er. Nivel en el edificio del Centro de Investigaciones Biomédicas, región Xalapa.**

#### CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

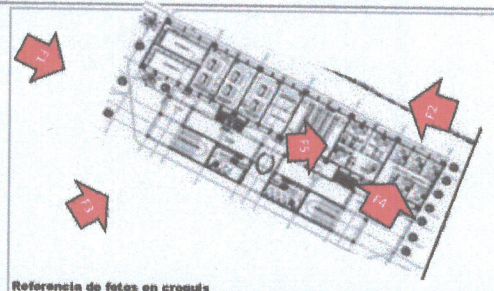

Referencia de fotos en croquis

#### UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CIRCUITO VERACRUZ No 8 COL. INDUSTRIAL ANIMAS, XALAPA, VER.

#### FOTOS



F1: Fachada principal



F2: Fachada lateral izquierda



F3: vista general de edificio



F4: Salones



F5: Área de subestación

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra concluida

Dr. Martín Gerardo Aguilar Salazar

Nombre y firma del Titular de la IES

M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
