

2022

AÑO

FAM
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES


 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

diciembre 2022

FECHA DE CORTE: 31/DIC/2022

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL
DATOS DE LA UNIVERSIDAD

 Universidad Veracruzana <small>Escuela de la universidad</small>	Nombre: Universidad Veracruzana										
	Entidad Federativa: Veracruz										
	Clave Inst 611-30MSL09408										
	RESPONSABLES										
	<table border="1"> <tr> <th>Planeación</th> <th>Obras y Mantenimiento</th> </tr> <tr> <td>Nombre: Mra. Norma Angélica Lagunes López</td> <td>Nombre: Arq. Miguel Ángel Cano Asseleih</td> </tr> <tr> <td>Cargo: Encargada de la Dirección de Planeación Institucional</td> <td>Cargo: Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento</td> </tr> <tr> <td>Teléfono: (228) 8421700 EXT. 12719</td> <td>Teléfono: (228) 8421700 EXT. 12702</td> </tr> <tr> <td>Correo electrónico: mlagunes@uv.mx</td> <td>Correo electrónico: micano@uv.mx</td> </tr> </table>	Planeación	Obras y Mantenimiento	Nombre: Mra. Norma Angélica Lagunes López	Nombre: Arq. Miguel Ángel Cano Asseleih	Cargo: Encargada de la Dirección de Planeación Institucional	Cargo: Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento	Teléfono: (228) 8421700 EXT. 12719	Teléfono: (228) 8421700 EXT. 12702	Correo electrónico: mlagunes@uv.mx	Correo electrónico: micano@uv.mx
Planeación	Obras y Mantenimiento										
Nombre: Mra. Norma Angélica Lagunes López	Nombre: Arq. Miguel Ángel Cano Asseleih										
Cargo: Encargada de la Dirección de Planeación Institucional	Cargo: Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento										
Teléfono: (228) 8421700 EXT. 12719	Teléfono: (228) 8421700 EXT. 12702										
Correo electrónico: mlagunes@uv.mx	Correo electrónico: micano@uv.mx										

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO
OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Romanente	Alcance del proyecto en cuantía a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuentas con Actas			
		Obras de construcción	Equipamiento	Adquisiciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustantivo	Espacio/grupo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recopilación (Acta final)	Acta Administrativa de Entrega-Recopilación	Monto de Acta Administrativa
GLOBAL DEL PROYECTO																								
1	Construcción de laboratorio y bioterio para Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ciencias Químicas, región Orizaba-Córdoba	X				\$ 7,500,000.00	\$ 3,410,897.05	\$ 4,089,302.95	Laboratorio 1 125.79 Sanitario 2 57.18 Áreas comunes 1 139.60 Bioterio 1 125.95 Site 1 7.15 TOTAL 6 458.65	Obra en proceso	Tramitar estimaciones	60	08/07/22	22/02/23	La asignación de recursos del FAM 2022 fue informada por la DGESEU mediante of. Num. 511/2022-080642 con fecha 18/feb/22. La reprogramación de obras del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2022 fue autorizada mediante oficio No. 611/2022-1509-13 de fecha 29 de marzo de 2022. A partir de esta fecha se iniciaron los trámites ante el Gobierno del Estado para la radicación de las ministraciones a la UV y a la fecha se han radicado la totalidad de los recursos de acuerdo al calendario de ministraciones mensuales.									
2	Conclusión de área técnico-académica y administrativa de Tlalagrá Centro Cultural, región Xalapa.	X				\$ 4,440,471.00	\$ 3,438,219.34	\$ 1,004,261.66	Aulas usos múltiples 3 121.85 Cubiertas 3 29.83 Oficinas administrativas 3 70.37 Sanitarias 2 5.86 Áreas comunes 4 118.98 Archivos académicos 2 24.30 Site 1 6.71 TOTAL 18 378.68	Obra concluida	Tramitar finiquito	100	04/07/22	21/10/22										
						\$11,940,471.00	\$6,849,116.39	\$5,093,554.61																

Dr. Martín Gerardo Aguilar Saldaña

Nombre y firma del Titular de la IES

Arq. Miguel Ángel Cano Asseleih

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

¹ Se considerará los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanto fotos como ser necesario.

² En esta acción se resalta de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.

³ Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2022

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
diciembre 2022

AÑO

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

FECHA DE CORTE: 31/DIC/2022

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRORIDAD

1

Nombre de la obra:

Construcción de laboratorio y bioterio para Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ciencias Químicas, región Orizaba-Córdoba





Universidad Veracruzana

Estado de la universidad

Porcentaje de avance


60%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

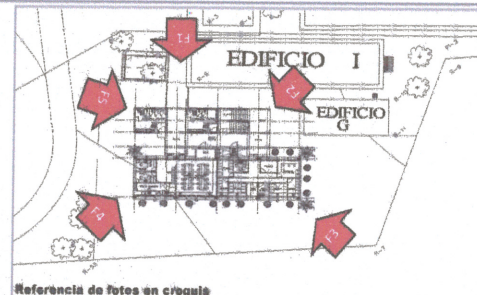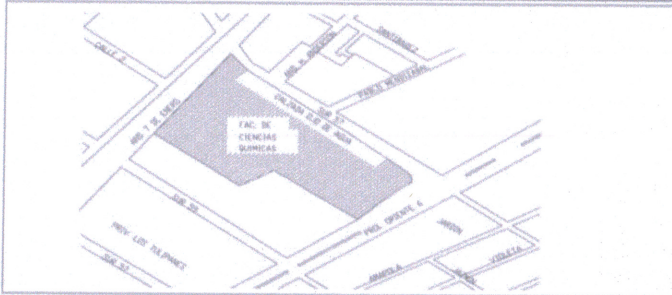

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



PROLONGACIÓN ORIENTE 6 No. 1009 COLONIA RAFAEL ALVARADO, ORIZABA, VER.

FOTOS



F1: Vista entre Bodega deportes y exterior Edificio I



F2: Vista esquina edificio I



F3: Vista exterior Edificio I y Bodega deportiva



F4: Vista Exterior hacia edificio G

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra en proceso



F5: Vista en esquina hacia edificio G

Dr. Martin Gerardo Aguilar Sanchez

Nombre y firma del Titular de la IES

Arq. Miguel Ángel Cano Asseleih

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexé reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2022

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

diciembre 2022

FECHA DE CORTE: 31/10/2022

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Universidad Veracruzana

Escudo de la universidad

Porcentaje de avance


100%

PRIORIDAD


2

Nombre de la obra: **Conclusión de área técnico-académica y administrativa de Tiaqná Centro Cultural, región Xalapa.**


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

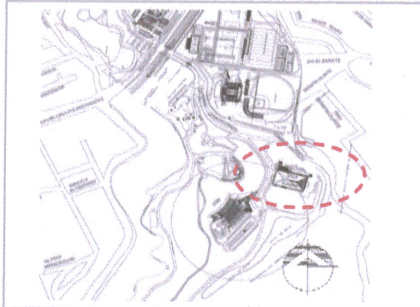

Referencia de fotos en croquis

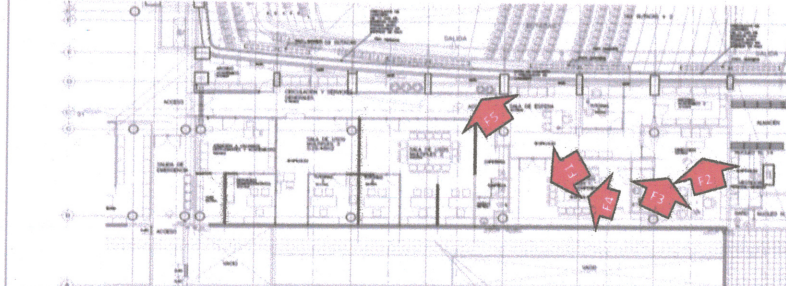

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

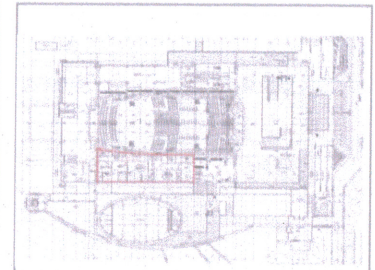

AV. DE LAS CULTURAS VERACRUZANAS No. 1 COLONIA EMILIANO ZAPATA, XALAPA, VER.

FOTOS

Comentarios de los trabajos realizados:


Obra concluida



F1: Vista interior área técnico-académica y administrativa



F2: Vista interior área técnico-académica y administrativa

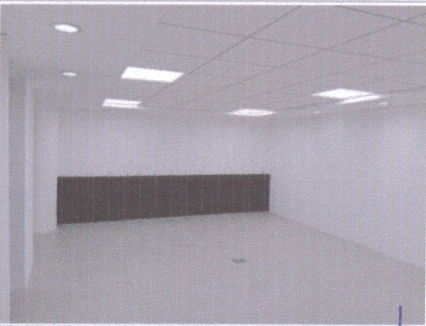

F3: Vista interior área técnico-académica y administrativa



F4: Vista interior área técnico-académica y administrativa



F5: Vista interior área técnico-académica y administrativa

Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez

Nombre y firma del Titular de la IES

Arq. Miguel Ángel Cano Asseleh

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial: se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
