

2022

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

septiembre 2022

FECHA DE CORTE: 30/SEP/2022

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad Veracruzana

Entidad Federativa: Veracruz

Clave Inst 911: 30MSU09408



Universidad Veracruzana

Escudo de la universidad

Planeación

Nombre: Mtra. Norma Angelina Lagunes López
Cargo: Encargada de la Dirección de Planeación Institucional
Teléfono: (228) 8421700 EXT. 12716
Correo electrónico: nlagunes@uv.mx

RESPONSABLES

Obras y Mantenimiento

Nombre: M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo
Cargo: Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento
Teléfono: (228) 8421700 EXT. 12702
Correo electrónico: erodiles@uv.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada				
		Obras de construcción	Equipamiento	Mejoras y ampliaciones	Mantenimiento	Proyecto sustentable				Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Cuenta con Actas		
																						Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa
GLOBAL DEL PROYECTO																								
1	Construcción de laboratorio y bioterio para Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ciencias Químicas, región Orizaba-Córdoba	X					\$ 7,500,000.00	\$ 628,505.38	\$ 6,871,494.64	Laboratorio 1 125.79 Sanitario 2 57.16 Áreas comunes 1 139.60 Bioterio 1 125.95 Site 1 7.15 TOTAL 6 455.48	Obra en proceso	Tramitar estimaciones	28	08/07/22	04/12/22	La asignación de recursos del FAM 2022 fue informada por la DGE/SII mediante of. Núm. 511/2022-0926-62 con fecha 19/feb/22. La reprogramación de obras del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2022 fue autorizada mediante oficio No. 511/2022-1509-13 de fecha 29 de marzo de 2022. A partir de esta fecha se iniciaron los trámites ante el Gobierno del Estado para la radicación de las ministraciones a la UV y a la fecha se han radicado \$ 7,990,314.00 de acuerdo al calendario de ministraciones mensuales.								
2	Conclusión de área técnico-académica y administrativa de Tlaque Centro Cultural, región Xalapa.	X					\$ 4,440,471.00	\$ 842,885.03	\$ 3,597,605.97	Aulas usos múltiples 3 121.85 Cubículos 3 29.93 Oficinas administrativas 3 70.37 Sanitarios 2 5.85 Áreas comunes 4 118.98 Archivos académicos 2 24.30 Site 1 6.71 TOTAL 18 378.06	Obra en proceso	Tramitar finiquito	99	04/07/22	01/10/22									
							\$11,940,471.00	\$1,471,370.39	\$10,469,100.61															

Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez

Nombre y firma del Titular de la IES

M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

¹ Se capturan los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanto fotos como sea necesario.

² En esta sección se redacta de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.

³ Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: día, mes y año.

2022

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
septiembre 2022
FECHA DE CORTE: 30/SEP/2022

AÑO

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



PRIMORDIAL

1


Nombre de la obra:

Construcción de laboratorio y bioterio para Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ciencias Químicas, región Orizaba-Córdoba

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

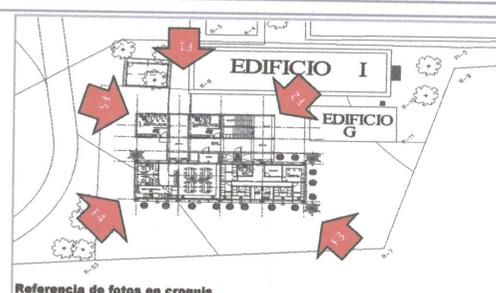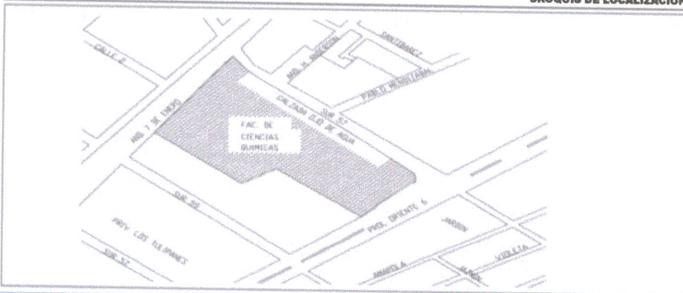

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



PROLONGACIÓN ORIENTE 6 No. 1009 COLONIA RAFAEL ALVARADO, ORIZABA, VER.



Universidad Veracruzana

Porcentaje de avance

28%

FOTOS



F1: Vista entre Bodega deportes y exterior Edificio I



F2: Vista esquina edificio I




F3: Vista exterior Edificio I y Bodega deportiva



F4: Vista Exterior hacia edificio G

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra en proceso

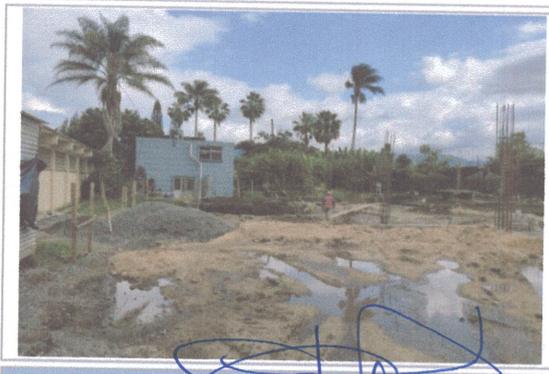

F5: Vista en esquina Edificio G

Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez
Nombre y firma del Titular de la IES

M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2022

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

septiembre_2022

FECHA DE CORTE: 30/SEP/2022

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Universidad Veracruzana

Escudo de la universidad

Porcentaje de avance


99%

PRICRIDAD


2

Nombre de la obra: **Conclusión de área técnico-académica y administrativa de Tlaqná Centro Cultural, región Xalapa.**


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

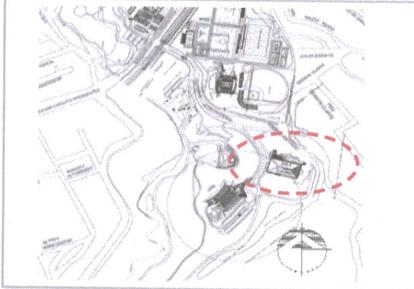

Referencia de fotos en croquis

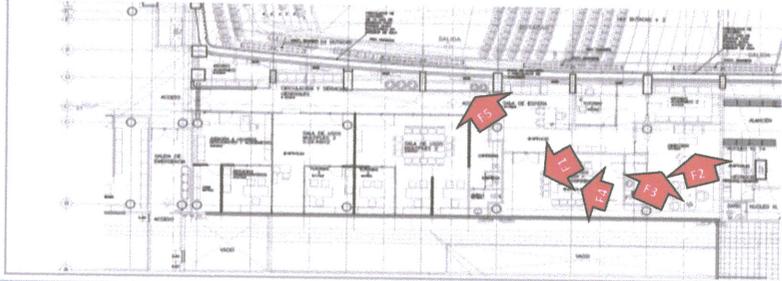

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

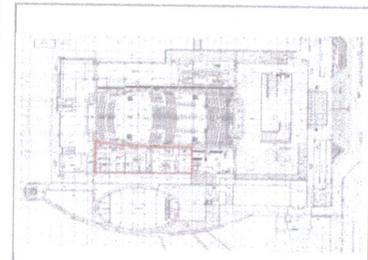

AV. DE LAS CULTURAS VERACRUZANAS No. 1 COLONIA EMILIANO ZAPATA, XALAPA, VER.

FOTOS



F1: Vista interior área técnico-académica y administrativa



F2: Vista interior área técnico-académica y administrativa



F3: Vista interior área técnico-académica y administrativa



F4: Vista interior área técnico-académica y administrativa

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra en proceso



F5: Vista interior área técnico-académica y administrativa

Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez

Nombre y firma del Titular de la IES

M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
