

2020

**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (ESPECIALMENTE REMONEDIOS FINANCIEROS)

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**marzo\_2021**  
FECHA DE CORTE: 31/MAR/2021

**REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL**

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: **Universidad Veracruzana**

Entidad Federativa: **Veracruz**

Clave Inst 911: **30MSL02H03**

Nombre: **Dra. Luiza Martínez Márquez**  
Cargo: **Directora de Planeación Institucional**  
Teléfono: **(01228) 5421170 EXT. 12718**  
Correo electrónico: **lmartinez@uv.mx**

**RESPONSABLES**

Nombre: **M. Arq. Emilia P. Rodiles Judo**  
Cargo: **Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento**  
Teléfono: **(01228) 5421170 EXT. 12702**  
Correo electrónico: **emrodiles@uv.mx**

**DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO**

**OBRA CONCLUIDA**

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Avance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>			Acciones que sustentan el avance <sup>2</sup>	Acciones por realizar	% de avance	Fechas <sup>3</sup>		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
		Obra de infraestructura	Edificación	Adquisición y mejoras	Manutención				Proyecto sustentado	Espacios/m²	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega- Recepción (Acta Inqueto)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción
1	Adaptación de espacio de Artes en el CUADCC, región Orizaba-Córdoba (complemento de recursos)	X				\$ 4,510.48	\$ -	\$ 4,510.48	Taller de Artes	1	300	Obra por iniciar	En proceso de contratación.	0	15/04/21	30/06/21	El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFPLAN), notificó a la Universidad Veracruzana la asignación de recursos del FAM 2020 Remanente Remedios Financieros la contratación mediante Cf. No. SFP/1796/2020 de fecha 05/06/2020 por \$4,810.48. La 2a. ministración mediante Cf. No. SFP/1935/2020 de fecha 23/06/2020 por \$192.28. La 3a. ministración mediante Cf. No. SFP/1948/2020 de fecha 28/06/2020 por \$278.73. Los recursos de la 1a y 2a ministración ya fueron radicados a la Universidad Veracruzana.						
2	Trabajos complementarios en el edificio para las facultades de Matemáticas, Física y el Centro de Investigaciones en Inteligencia Artificial, campus Sur, región Xalapa. (complemento de recursos)	X				\$ 773.00	\$ -	\$ 773.00	Obra complementaria	1	6006.90	Obra por iniciar	En proceso de contratación.	0	15/04/21	30/06/21							
						<b>\$5,283.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,283.53</b>															

Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

<sup>1</sup> Se censuran los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se deberá anexar lente-fijas como sea necesario.  
<sup>2</sup> En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, siempre que se verán reflejados en el reporte físico.  
<sup>3</sup> Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en día ceros del mes y año.

2020

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PERMANENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS)

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

marzo\_2021

FECHA DE CORTE: 31/03/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PROYECTO

1

Nombre de la obra: **Adaptación de espacio de Artes en el CUACC, región Orizaba-Córdoba (complemento de recursos)**




Universidad Veracruzana


Porcentaje de avance

0%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

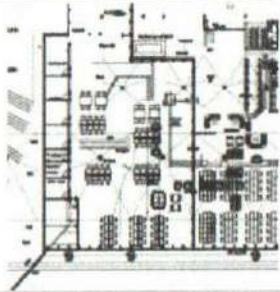


Referencia de fotos en croquis

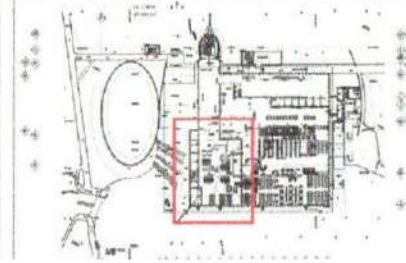

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

croquis de localización:



AV. PROLONGACIÓN BEISBORAMA SN COL. STA. MARGARITA (BOULEVARD UNIVERSITARIO, CORDOBA, VER.)

FOTOS



F1: VISTA INTERIOR



F2: ESCALERAS

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra por iniciar



F3: VISTA CUBICULOS



F4: VISTA GENERAL



F5: VISTA GENERAL

*[Signature]*  
Dra. Sara D. Leizaola de Quiñana González

Nombre y firma del Titular de la IES

*[Signature]*  
M. Anq. Estela P. Rodríguez

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



2020

AÑO

**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PERMANENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS)

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

marzo\_2021

FECHA DE CORTE: 31/03/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Universidad Veracruzana

Porcentaje de avance

0%



PROYECTO

2

Nombre de la obra:

Trabajos complementarios en el edificio para las facultades de Matemáticas, Física y el Centro de Investigaciones en Inteligencia Artificial, campus Sur, región Xalapa. (complemento de recursos)

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

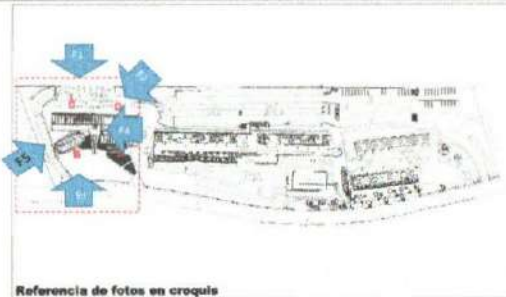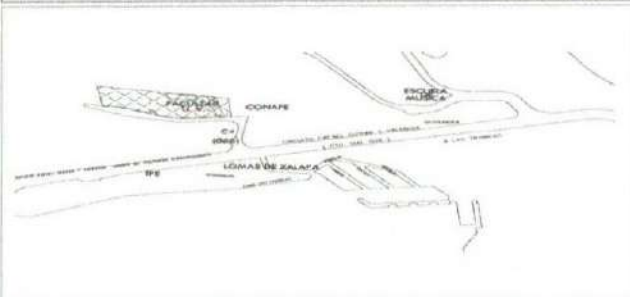

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CALLE PASEO No. 112, LOTE II SECC. 2A, LETRA B, COL. DESARROLLO HABITACIONAL NUEVA XALAPA, XALAPA, VER.

FOTOS



F1: Edificio A y E: Fachada Posterior



F2: Edificio A: Fachada Interior

Comentarios de los trabajos realizados:  
  
Obra por iniciar



F3: Edificio E: Fachada Principal



F4: Edificio D: Fachada Posterior



F5: Edificio C: Fachada Posterior

Dra. Elva D. Estrada de Acevedo González

Nombre y firma del Titular de la IES

M. An. Emilia P. Ramírez Justo

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recuerda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
