

2020

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PERMANENTE REEMBOLSOS FINANCIEROS)

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado:
septiembre_2021
FECHA DE VORTE: 30/SEP/2021

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: **Universidad Veracruzana**

Entidad Federativa: **Veracruz**

Clave Inst: **911-30MSU09408**

Planeación
Nombre: **Mtra. Norma Angélica Leguines López**
Cargo: **Encargada de la Dirección de Planeación Institucional**
Teléfono: **(01228) 8421700 EXT. 12718**
Correo electrónico: **nleguines@uv.mx**

RESPONSABLES

Obras y Mantenimiento
Nombre: **M. Arq. Erika P. Roldán Justo**
Cargo: **Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento**
Teléfono: **(01228) 8421700 EXT. 42732**
Correo electrónico: **eroldan@uv.mx**

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
		Obras de construcción	Equipamiento	Alfombrados y pisos	Reformaciones				Proyecto sustentado	Especie/quipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Termino	Entrega-Recpción (Acta Inauguro)	Acta Administrativa de Entrega-Recpción	Monto de Acta Administrativa	
																							¿Cuenta con fotos del evento?
GLOBAL DEL PROYECTO																							
1	Adaptación de espacio de Artes en el CUACC, región Orizaba-Córdoba (complemento de recursos)	X				\$ 4,510.48	\$ 4,437.97	72.51	Taller de Artes	1	360	Obras concluida	100	18/05/21	27/07/21	El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFP/PLAN), notificó a la Universidad Veracruzana la asignación de recursos del FAM 2020 Remanente Rendimientos. Financie la inversión mediante CF No. SFP/1796/2020 de fecha 08/05/2020 por \$4,510.48. La 2a. ministración mediante CF No. SFP/1830/2020 de fecha 23/05/2020 por \$363.26. La 3a ministración mediante CF No. SFP/1948/2020 de fecha 29/06/2020 por \$379.78. La totalidad de los recursos ya fueron radicados a la Universidad Veracruzana.				SI	SI	34,437.97	
2	Trabajos complementarios en el edificio para las facultades de Matemáticas, Física y el Centro de Investigaciones en Inteligencia Artificial, campos Sur, región Xalapa. (complemento de recursos)	X				\$ 773.05	\$ 773.05	-	Obras complementaria	1	6096.90	Obras concluida	100	11/05/21	10/07/21		SI	Recibo Oro. Serie C. Laminado de Diamante Genus/16/06/21	SI	SI	1773.05		
						\$5,283.53	\$5,211.02	\$72.51															

Nota: Con este reporte se conserva la totalidad de recursos de este Fondo, existiendo un remanente de \$72.51 que será reintegrado a la TESOF

Dr. Martín Gerardo Aguilar Villalón
Nombre y firma del Titular de Planeación

M. Arq. Erika P. Roldán Justo
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

¹ Se mencionan las acciones que caracterizan a la obra o evento. Se podrán anexar tanto files como sus parámetros.
² En este sección se detallan de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se van reflejando al reporte trimestral.
³ En esta sección se detallan las fechas de inicio y término según actualizadas. Todas en dos dígitos, día, mes y año.

2020

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
septiembre_2021
FECHA DE CORTE: 29/09/2021

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FONDOS DE REFINANCIAMIENTO FINANCIERO)

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Universidad Veracruzana

Porcentaje de avance

Porcentaje de avance

100%



UNIDAD

1

Nombre de la obra:

Adaptación de espacio de Artes en el CUACC, región Orizaba-Córdoba (complemento de recursos)

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

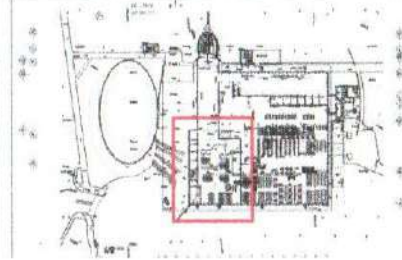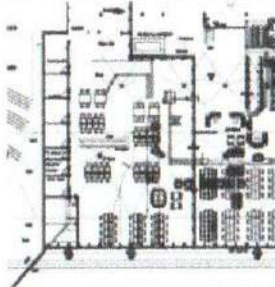

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

croquis de localización:




AV. PROLONGACIÓN BEISBORAMA EN COL. STA. MARGARITA
(BOULEVARD UNIVERSITARIO, CORDOBA, VER.)

FOTOS




F1: VISTA INTERIOR

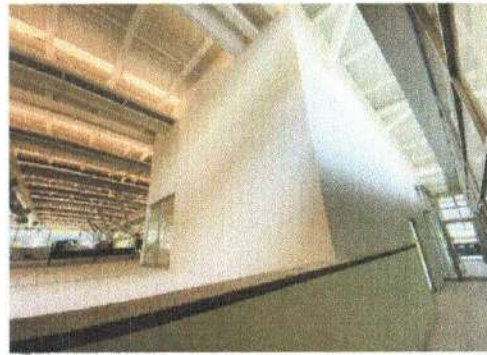

F2: ESCALERAS

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra concluida

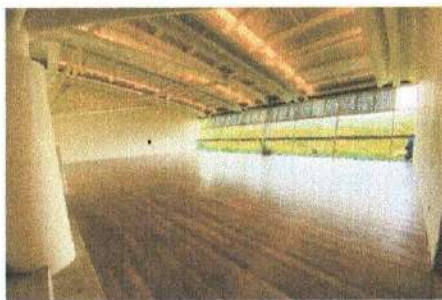

F3: VISTA CUBICULOS



F4: VISTA GENERAL



F5: VISTA GENERAL

Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez

Nombre y firma del Titular de la IES

M. Arq. Emilio P. Rodiles Mateo

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexa reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado:
septiembre_2021
FECHA DE FONTE: 30-SEP-2021

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (REMANENTES RENDIMIENTOS FINANCIEROS)
REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Universidad Veracruzana

Porcentaje de avance

100%



PROYECTO

2

Nombre de la obra:

Trabajos complementarios en el edificio para las facultades de Matemáticas, Física y el Centro de Investigaciones en Inteligencia Artificial, campus Sur, región Xalapa. (complemento de recursos)

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

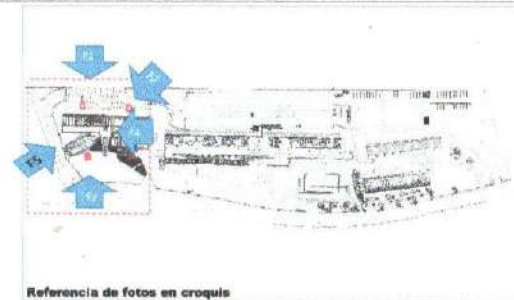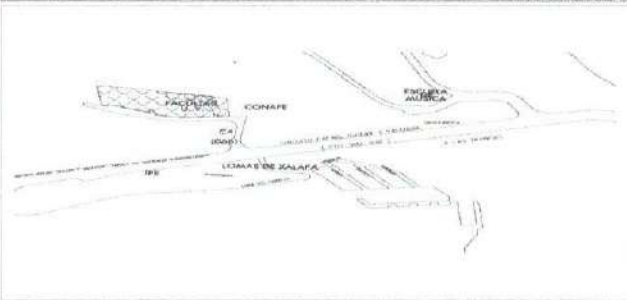

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CALLE PASEO No. 112, LOTE B SECC. 2A, LETRA B, COL. DEGRARROLLO HABITACIONAL NUEVA XALAPA, XALAPA, VER.

FOTOS



F1: Edificio A y E: Fachada Posterior



F2: Edificio A: Fachada Interior



F3: Edificio E: Fachada Principal



F4: Edificio D: Fachada Posterior

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra concluida



F5: Edificio C: Fachada Posterior

Dr. Martín Gerardo Aguilar Rodríguez
Nombre y firma del Titular de la IES

M. Art. Emilio P. Rodríguez Justo
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
