

2021

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (RENDIMIENTOS FINANCIEROS)

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA


Mes reportado

diciembre 2021

SEPIA/TICORTE/UE18/2021

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

 Universidad Veracruzana <small>Fuente de la Universidad</small>	Nombre: Universidad Veracruzana Entidad Federativa: Veracruz Clave Inst 911: 3048L09408	RESPONSABLES Planeación: Mra. Norma Angélica Leganes López Cargo: Encargada de la Dirección de Planeación Institucional Teléfono: (228) 8421700 EXT. 12718 Correo electrónico: nlaganes@uv.mx		Obras y Mantenimiento: M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo Cargo: Directora de Proyecto, Construcciones y Mantenimiento Teléfono: (228) 8421700 EXT. 12702 Correo electrónico: erodiles@uv.mx	
---	--	--	--	---	--

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas					
		Obras de infraestructura	Equipamiento	Adquisición y mejora de mobiliario	Mantenimiento				Proyecto institucional	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta físico)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa		
1	Construcción de cisternas para almacenamiento de agua pluvial en la Unidad de Ciencias de la Salud en Minatitlán, región Coahuila de Zaragoza			X		\$ 225,830.00	\$	\$ 225,830.00	Cisternas	2	ton	Obra en proceso	Transferir estimaciones	5	20/12/21	18/01/22	El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEDFIN) ratifica a la Universidad Veracruzana la asignación de recursos del FAM 2021 Rendimientos Financieros la autorización mediante el no. SPP/1430/2021 de fecha 04/Nov/2021 por \$69,886.00. Los recursos en su totalidad ya fueron radicados a la Universidad Veracruzana.									
						\$225,830.00	\$0.00	\$225,830.00																		

Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez
Nombre y firma del Titular de la IES

M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

¹ Se capturan los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán omitir varias filas como sea necesario.
² En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se ven reflejados en el reporte fotográfico.
³ Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: día, mes y año.

2021

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (RENDIMIENTOS FINANCIEROS)

Mes reportado
diciembre_2021
FECHA DE CORTE: 31/01/2021

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Universidad Veracruzana

Porcentaje de avance

5%


PRIORIDAD

1

Nombre de la obra:

Construcción de cisternas para almacenamiento de agua pluvial en la Unidad de Ciencias de la salud en Minatitlán, región Coahuila-Coahuila- Minatitlán

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

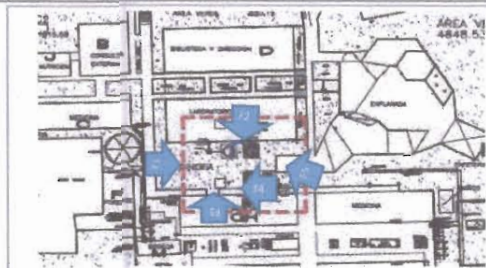

Referencia de foto en croquis

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO



MANAGUA ESO, BERLIN, MADRID, PANAMA, COL. NUEVA MINATITLAN
MANZ 27 Y 31, MINATITLAN, VBR.

FOTOS



F1: Vista Exterior frontal



F2: Vista Exterior lateral



F3: Vista Exterior lateral



F4: Vista Exterior posterior

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra en proceso

Dr. Martín Gerardo Aguilar Ballebez

Nombre y firma del Titular de la IES

M. Arq. Emilia P. Rodríguez

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexará una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
