

2020

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (REMANENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS)

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
diciembre 2021

FECHA DE CURTE: 31/03/2021

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad Veracruzana

Entidad Federativa: Veracruz

Ciave Inst 011-30MSU09409

Universidad Veracruzana

Nombre: Mtra. Norma Angélica Legunes López
Cargo: Encargada de la Dirección de Planeación Institucional
Teléfono: (228) 8421700 EXT. 12718
Correo electrónico: nlegunes@uv.mx

RESPONSABLES

Nombre: M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo
Cargo: Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento
Teléfono: (228) 8421700 EXT. 12902
Correo electrónico: erodiles@uv.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fecha ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada				
		Obras de restauración	Rehabilitación	Adquisición y reparación	Modernización	Proyectos puntuales				Espacios	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Termino			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega- Recepción (Acta- Iniquito)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción	Monto de Acta Administrativa
GLOBAL DEL PROYECTO																								
1	Adaptación de espacio de Artes en el CUACC, región Orizaba-Córdoba (complemento de recursos)		X				\$ 4,910.48	\$ 4,437.97	\$ 72.51	Taller de Artes	1	380	Obra concluida		100	18/06/21	27/07/21	El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFPLAN), notificó a la Universidad Veracruzana la asignación de recursos del FAM 2020 Remanente Rendimientos Financieros 1a. ministración mediante Of. No. SFRV1794/2020 de fecha 08/dic/2020 por \$4,910.48. La 2a. ministración mediante Of. No. SFRV138/2020 de fecha 23/dic/2020 por \$383.28. La 3a. ministración mediante Of. No. SFRV1046/020 de fecha 28/dic/2020 por \$378.73. La 4a. ministración mediante Of. No. SFRV1218/021 de fecha 11/1/2021 por \$102,336.19. La totalidad de los recursos ya fueron recibidos a la Universidad Veracruzana.	NO			SI	SI	\$4,437.97
2	Trabajos complementarios en el edificio para las facultades de Matemáticas, Física y el Centro de Investigaciones en Inteligencia Artificial, campus Sur, región Xalapa. (complemento de recursos)	X					\$ 773.05	\$ 773.05	\$ -	Obras complementarias	1	6068.90	Obra concluida		100	11/06/21	10/07/21		SI	SI	Factora Dra. Sara D. Ladrón de Guebara Gonzalez, 16/ene/21	SI	SI	\$773.05
3	Construcción de cubículos en planta alta de edificio "K" (CIDEA) del Centro de Institutos, región Xalapa (complemento de recursos)	X					\$ 102,336.19	\$ -	\$ 102,336.19	Cubículos	11	140.00	Obra en proceso	Tramitar estimación	5	16/12/21	28/01/22							
							\$107,519.72	\$5,211.02	\$102,308.70															

Dr. Martin Gerardo Aguilar Sánchez

Nombre y firma del Titular de la IES

M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

¹ Se detallan las acciones que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tantas filas como sea necesario.
² En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se vanar reflejados en el reporte fotográfico.
³ Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en día cúbico, de mayo en adelante.

2020

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (REPARANTE Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS)

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
diciembre_2021
FECHA DE CORTE: FEBRERO

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Universidad Veracruzana

Porcentaje de avance

100%



PROYECTO

1

Nombre de la obra:

Adaptación de espacio de Artes en el CUACC, región Orizaba-Córdoba (complemento de recursos)

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

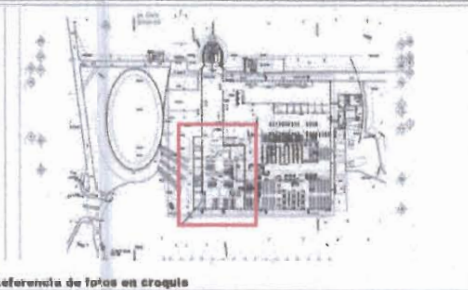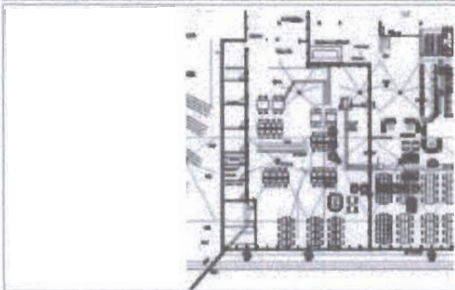

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

croquis de localización:



AV. PROLONGACIÓN BEIBORAMA S/N COL. STA. MARGARITA
(BOULEVARD UNIVERSITARIO, CORDOBA, VER.)

FOTOS



F1: VISTA INTERIOR



F2: ESCALERAS

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra concluida



F3: VISTA CURVICULOS



F4: VISTA GENERAL



F5: VISTA GENERAL

Dr. María Guzmán Aguilar Méndez

Nombre y firma del Titular de la IES

M. Arq. Emilio R. Barrios Jorja

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PERMANENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS)

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
diciembre 2021
FECHA DE CORTE: 30/09/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL





Universidad Veracruzana

Porcentaje de avance

100%

PROYECTO 2 Nombre de la obra: **Trabajos complementarios en el edificio para las facultades de Matemáticas, Física y el Centro de Investigaciones en Inteligencia Artificial, campus Sur, región Xalapa. (complemento de recursos)**

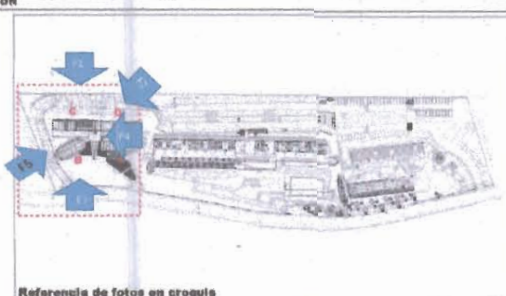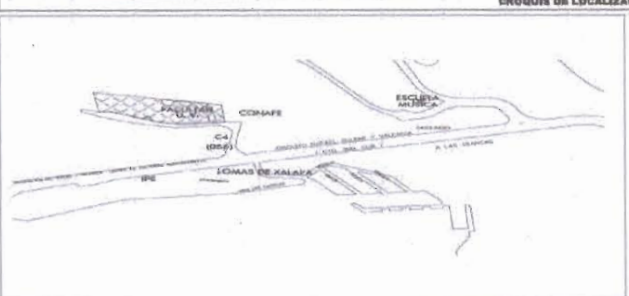

FOTOS



F1: Edificio A y E. Fachada Posterior



F2: Edificio A. Fachada Interior



F3: Edificio E. Fachada Principal



F4: Edificio D. Fachada Posterior

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra concluida



F5: Edificio C. Fachada Posterior

Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez

Nombre y firma del Titular de la IES.

M. Aq. Emilio P. Rodríguez

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestana se podrán copiar tantas pestanas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adopciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (REMÁNENTE Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS)

Mes reportado
diciembre_2021
FECHA DE CONFECCIÓN

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Universidad Veracruzana

Basado en la información

Porcentaje de avance

5%

PRECEDENCIA **3** Nombre de la obra: **Construcción de cubículos en planta alta de edificio "R" (CIDEA) del Centro de Institutos, región Xajapa (complemento de recursos)**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CIRCUITO VERACRUZ No 6 COL. INDUSTRIAL ANIMAS, XAJAPA, VER.

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: Primer Nivel laboratorios

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra en proceso



F3: Vista general primer nivel



F4: Vista general primer nivel



F5: Primer nivel

Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez

Nombre y firma del Titular de la IEB

M. Arq. Estrella P. Roldán Juárez

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IEB

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
